

**OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA NAČRTA RAZVOJNIH
PROGRAMOV OBČINE TIŠINA V LETU 2017 – PO PROJEKTIH**

Načrt razvojnih programov je obvezni sestavi del proračuna. Sestavljajo ga letni načrti oziroma plani razvojnih programov neposrednih proračunskih uporabnikov občinskega proračuna za prihodnje proračunsko leta in za tri prihodnja leta. V njem se opredelijo ključni programi oz. projekti, predvsem investicijske porabe za srednjeročno obdobje. Umeščenost posameznega programa oz. projekta v NRP je predpogoj, da lahko občina s tem projektom kandidira na razpisih za pridobitev državnih ali evropskih sredstev. V načrtu razvojnih programov se tako načrtujejo izdatki proračuna za investicije oz. projekte pri katerih pričakujemo uspešnost prijave na razpisih posameznih ministrstev in pridobitev državne pomoči v prihodnjih štirih letih.

Programi oz. projekti so opredeljeni po:

- **posameznih projektih oziroma programih**
- **letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračun prihodnjih let**
- **virih financiranja.**

V načrt razvojnih programov za obdobje 2017 -2020 so bili prednostno uvrščeni projekti in programi, ki so že bili začeti v preteklih letih in so bili predvideni za izvajanje v letu, za katero se sprejema proračun, prav tako pa so v NRP leta 2017 bili uvrščeni nekateri novi projekti.

Večji realizirani projekti v letu 2017:

- ❖ **Agromelioracije**
- ❖ **Rekonstrukcija lokalne ceste na Krajni – II faza**
- ❖ **Nakup prostora v poslovno stanovanjskem objektu na Tišini**
- ❖ **Večnamenska športna dvorana s komunalno in prometno ureditvijo**
- ❖ **Pomurski vodovod – II faza**
- ❖ **Infrastruktura na podeželju**
- ❖ **Sofinanciranje investicij – GZ Tišina**
- ❖ **Širitev kanalizacijskega omrežja**
- ❖ **Kmetijske spodbude- subvencije v sklopu javnega razpisa**
- ❖ **Dobava in montaža Pergotende v vrteu Bibe**

V nadaljevanju podajamo kratke obrazložitve in morebitna odstopanja od veljavnega plana po posameznih projektih in področjih porabe:

10 OBČINSKI SVET

Področje porabe 04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

04029001 Informacijska infrastruktura

100403 INFORMATIZACIJA OBČINSKEGA SVETA

1004 – 01 Informatizacija občinskega sveta

V višini 6.236 EUR so realizirani stroški za namen nakupa računalnikov za potrebe članov občinskega sveta. Realizirana sredstva temeljijo na podlagi sprejetega sklepa občinskega sveta

na svoji 23. Redni seji. Z predajo računalnikov v uporabo se je ukinilo tiskano gradivo za seje občinskega sveta. Članom občinskega sveta so se računalniki predali v uporabo za obdobje časa trajanja mandata. Po izteku mandata računalnike vrnejo v trajno last Občine Tišina.

40 OBČINSKA UPRAVA

Področje porabe 04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

04029001 Informacijska infrastruktura

400401 INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA – STROJNA OPREMA

4004 – 01 Informacijska in komunikacijska oprema občinske uprave

V letu 2017 je bil realiziran nakup oz. zamenjava dveh računalnikov za potrebe delovanja občinske uprave ter nakup dveh novih prenosnih računalnikov, ki jih bodo uslužbenci uporabljali na sejah odborov, komisij in občinskega sveta. Sredstva nakupa potrebne računalniške opreme so znašala 3.448 EUR.

Področje porabe 07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

400706 SOFINANCIRANJE NABAVE OPREME IN GASILSKIH VOZIL

4007 – 05 Sofinanciranje investicij OGZ – oprema in vozila

Na podlagi veljavnega plana so v letu 2017 bili realizirani stroški sofinanciranja nakupa novega gasilskega vozila za PGD Gederovci (9.200 EUR), sofinanciranje motorne brizgalne PGD Gradišče in PGD Krajna (7.000 EUR) ter sofinanciranje nakupa rabljenega gasilske cisterne za PGD Petanjce.

400707 SOFINANCIRANJE NABAVE OPREME IN GASILSKIH VOZIL – POŽARNA TAKSA

4007 – 04 Sofinanciranje investicij OGZ – požarna taksa

Požarna taksa v višini **8.905 EUR** je bila prenakazana na Gasilsko zvezo Tišina (od tega je bilo 661 EUR še iz naslova prenakazila za mesec december 2016). Gasilska zveza je prenakazano požarno takso v celoti porabila za sofinanciranje novega gasilskega vozila PGD Gederovci. Občina Tišina je v letu 2017 tako iz naslova požarne takse prejela skupaj **9.697 EUR** namenskih sredstev. Preostanek dela sredstev iz naslova požarne takse za leto 2017 je bil GZ Tišina v višini 1.453 EUR prenakazan v začetku leta 2018 (upoštevani tudi poračun za mesec december 2017 – obvestilo s strani Požarnega sklada).

Področje porabe 11 – KMETIJSTVO , GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

401110 INFRASTRUKTURA NA PODEŽELJU

4011 – 04 Urejanje odvodnjavanja po vaseh

Stroški urejanja odvodnje po vaseh so v letu 2017 realizirani v višini 50.442 EUR. Največji delež realiziranih stroškov je pripadal rekonstrukciji mostu v naselju Gederovci v okviru katerega je bilo realiziranih dobrih 39 tisoč EUR. Stroški načrtov in priprave dokumentacije so realizirani v višini 10.959 EUR (izdelava projektne dokumentacije za namen rekonstrukcije mostu v naselju Gederovci ter izdelava projektne dokumentacije namenjene pritoku vodotoka čez Mokoš). V okviru tekočega vzdrževanja pa so realizirani stroški ureditve ponikovalnice na Petanjcih – 1.150 EUR.

11029003 Zemljiške operacije

401114 AGROMELIORACIJE

Projekt »agromelioracije« je v letu 2017 realiziran v višini 125.501 EUR. V prvi polovici leta so bili v zvezi z prijavo naj javni razpis »agromelioracije« realizirani stroški priprave ustrezne dokumentacije in stroški priprave vloge. Za ta namen je bilo realiziranih skupaj 110 tisoč EUR. Stroški svetovanja v postopku izvedbe javnega naročila pa so znašali dobrih 16 tisoč EUR. V celoti so ostali nerealizirani stroški za namen morebitnega začetka izvedbenih del, saj je občina odločbe o uvedbi agromelioracij prejela šele v mesecu avgustu 2017. Iz omenjenega razloga zato tudi 91 % realizacija na pram načrtovanemu planu.

Na omenjenem področju je v letu 2017 vidna realizacija na naslednjih projektih:

- 4011 – 30 Agromelioracije – agromelioracijsko območje Borejci
- 4011 – 32 Agromelioracije – agromelioracijsko območje Sodišinci
- 4011 – 25 Agromelioracije – agromelioracijsko območje Murski Petrovci
- 4011 – 33 Agromelioracije – agromelioracijsko območje Krajna
- 4011 – 26 Agromelioracije – agromelioracijsko območje Gederovci
- 4011 – 29 Agromelioracije – agromelioracijsko območje Vanča Vas
- 4011 – 31 Agromelioracije – agromelioracijsko območje Gradišče
- 4011 – 27 agromelioracije – agromelioracijsko območje Murski Črnici
- 4011 – 34 Agromelioracije – agromelioracijsko območje Rankovci

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga

401105 NEPOSREDNA PLAČILA V KMETIJSTVU - REGRESI

4011 –02 Kmetijska spodbude – regresi – DP

V drugi polovici leta je bil objavljen Javni razpis na podlagi sprejetega Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Tišina za programsko obdobje 2015-2020. **Razdelitev sredstev javnega razpisa:**

Podpora delovanju društev: Čebelarstvo društvo Tišina 775 EUR, Društvo žena in deklet Sončnica 775 EUR, Lovska družina Tišina 775 EUR, Ribiška družina Gornja Radgona TE Tišina 775 EUR – skupaj 3.100 EUR. Za namen pomoči za plačilo zavarovalnih premij je bili skupaj realiziranih 3.328 EUR, sredstva za namen podpore rodovitnosti tal pa so znašala dobrih 7.600 EUR. Projekt je v NRP uvrščen iz razloga, ker je del javnega razpisa povezan z pomočmi DEMINIMUS.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

401107 GOZDNE CESTE

4011 –35 Gozdne ceste

Vzdrževanje gozdnih cest je tudi v letu 2017 potekalo po programu, ki ga je pripravil Zavod za gozdove Slovenije Območna enota Murska Sobota. Izbiro izvajalca del je opravila občina Tišina. Za vzdrževanje gozdnih cest je obvezna poraba sredstev iz pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest v okviru primerne porabe (namenski prihodki). Ker pa so pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest premajhne, del sredstev zagotavlja občina iz lastnih virov, del sredstev pa se zagotavlja tudi iz državnega proračuna v skladu z pogodbo o vzdrževanju gozdnih cest. Tako kot v preteklih letih so se tudi v letu 2017 vzdrževale gozdne ceste v skladu s programom Zavoda za gozdove, OE Murska Sobota. Vzdrževalna dela na gozdnih cestah so vrednostno realizirana v višini **5.833 EUR**. V okviru postavke pa so realizirani še stroški pristojbine v višini **11 EUR**. Za namen vzdrževanja gozdnih cest so bila v letu 2017 uporabljena sredstva iz naslova koncesijske dajatve v višini 528 EUR ter sredstva iz naslova sofinanciranja gozdnih cest s strani Ministrstva za kmetijstvo v višini 2.846 EUR. Lasten delež sredstev občine za tovrstno vzdrževanje znaša 2.459 EUR.

Področje porabe 12 –PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

401202 UČINKOVITA RABA ENERGIJE

4012 –04 Lokalni energetski koncept občine Tišina

V okviru projekta je bila realizirana izdelava šestih energetskih izkaznic za stavbe v kompletu: občinska stavba, novi vrtec Tišina, OŠ Tišina, Poslovno stanovanjski objekt, Podružnična šola Gederovci, stanovanje v stanovanjskem bloku na Tišini). Z navedeno realizaciji je bil cilj v celoti dosežen.

Področje porabe 13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

13029002 Cestni promet in infrastruktura

401312 IZGRADNJA IN INV. VZDRŽEVANJE DRUGIH LC IN JP

4013 –30 Rekonstrukcija LC na Krajni-II faza

Realizacija projekta v višini 134.593 EUR se nanaša na »Rekonstrukcijo lokalne ceste Krajna-II faza«. Stroški izgradnje so znašali 126.261 tisoč EUR, ostali del v višini 2.660 EUR pa se navezuje na stroške (varnostnega načrta, svetovanja v postopku javnega naročila, koordinacijo v času izvajanja del), stroški izdelave projektne dokumentacije so evidentirani v višini 1.171 EUR, stroški nadzora pa v višini 4.500 EUR. itd. Kot vir financiranja so bila za izvedbo črpana sredstva iz naslova 23. Člena ZFO-1 v višini 38.736 EUR. Prav tako pa so bila kot vir financiranja črpana tudi povratno kreditna sredstva v višini 58.104 EUR. Izbrani izvajalec navedene rekonstrukcije je bilo podjetje GMW Turjanci. Rekonstrukcija pa je zajemala okrog 330 m.

Z zaključkom drugega dela rekonstrukcije smo dodali dodano vrednost k boljšim pogojem glede prometne varnosti, ki bo v celoti zagotovljena šele z zaključkom III faze, saj se ob sami preplastitvi vozišča urejajo tudi hodniki za pešce oz. kolesarje. Realizacija projekta je v primerjavi z načrtovanim planom realizirana v višini 92 % načrtovanega plana, na kar je vplivala dejanska pogodbeno vrednost izbranega izvajalca del.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

401329 DOKUMENTACIJA – DRŽAVNA CESTA R2-440, odsek 1294

4013 –44 Priprava projektne dokumentacije za državno cesto R2-440, odsek 1294

Petanji, Gederovci, Krajna

Podprogram je v letu 2017 ostal v celoti neizkoriščen, saj s strani Direkcije za infrastrukturo do konca leta še vedno nismo prejeli projektne naloge povezane z izdelavo dokumentacije državne ceste R2-440 odsek 1294- **PP 401329**. Sredstva plana se ponovno načrtujejo v proračunu leta 2018.

Področja porabe 14 - GOSPODARSTVO

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

401411 POSPEŠEVANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA

4014 – 12 Pospeševanje razvoja malega gospodarstva

Na omenjenem projektu so v letu 2017 realizirana sredstva že izvedenega javnega razpisa za dodeljevanje pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Tišina v letu 2017.

Na podlagi izvedenega javnega razpisa je bilo razdeljenih 33.837 EUR. Na razpis je prispelo 11 vlog od katerih dve vlogi nista izpolnjevali pogojev javnega razpisa. Projekt je v primerjavi z načrtovanim planom realiziran v višini 85 % načrtovanega plana.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

401410 TURISTIČNA INFRASTRUKTURA - OBJEKTI

4014 – 14 Večnamenski in turistični objekt Gederovci

Projekt je v primerjavi z načrtovanim planom realiziran v višini 69 %. Realizacija se nanaša na stroške poslovno projektne svetovanja pri izvedbi postopka oddaje NMV-projektiranje in izdelavo potrebne dokumentacije za preureditev mejnega prehoda Gederovci povezani z idejno zasnovo, ki smo jo morali priložiti k vlogi za brezplačno pridobitev objekta. Ostali del priprave dokumentacije je predviden v letu 2018.

Področje porabe 15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

401501 IZGRADNJA ZBIRNO-SORTIRNEGA CENTRA PUCONCI - CERO

4015 – 01 Zbirno sortirni center Puconci – CERO

Projekt vključuje nadaljevanje in dokončanje sofinanciranja investicije izgradnje regijskega Zbirno sortirnega centra za odpadke CEROP Puconci-faza II. Ta del predstavlja razliko višine DDV-ja za račune (najemnina in nepremičnine povezane z investicijskim vlaganjem) izdane za mesec december 2017, realizirane v mesecu januarju 2018.

Področje porabe 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKA KOMUNALNA DEJAVNOST

16039005 Druge komunalne dejavnosti

401628 – LAS GORIČKO-CLLD

4016 - 17 Kolesarska steza Vanča Vas-Tišina

V okviru projekta so v letu 2017 realizirani stroški priprave DIIP dokumentacije.

4016 - 24 Trije parki, kulture, miru in oddiha

Realizacija projekta znaša 1.913 EUR in se navezuje na stroške priprave DIIP dokumentacije, ter stroški izdelave načrta za paviljon. V celoti pa ne prihaja do realizacije za namen začetka izvedbenih del, ki se v celoti prenašajo v leto 2018. Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija je kot nosilec projekta projekt prijavila na javni poziv LAS Goričko. Občina Tišina v projektu skupaj z občino Cankova nastopa kot partner tega projekta. Ob pripravi tega poročila razpolagamo le še z informacijo, da je projekt bil na javnem pozivu uspešen, vendar še do danes nismo prejeli odločbe s strani sofinancerja.

401629 – UREDITEV BRVI NA TIŠINI

4016 - 22 Ureditev brvi za navezavo parka na parkirišču pri pokopališču Tišina

V letu 2017 je bila na podlagi načrtovanega plana realizirana priprava projektne dokumentacije lesene brvi preko potoka Mokoš v naselju Tišina. Stroški tovrstne izdelave so znašali dobrih 6.000 EUR. Vloga na ARSO je bila oddana, pogodba nam še ni bila posredovana, tako, da stroški v zvezi z pridobitvijo stavbne pravice, ki je potrebna zaradi brvi čez potok Mokoš, ki je v lasti državi ostajajo nerealizirani. Nadaljevanje projekta je predvideno v letu 2020.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

4016 – 03 Poslovno-stanovanjski objekt Tišina

V prvi polovici leta je bila opravljena sanacija oz. obnova ene kopalnice, prav tako pa so bili realizirani stroški dotrajanih oken v stanovanjskem delu PSO objekta. Postavka je realizirana v višini 11.307 EUR oz. 81 % načrtovanega plana. Celotna višina realizacije je bila odvisna od najugodnejšega ponudnika za opravljanje tovrstnih storitev.

Področje porabe 18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

18059001 Programi športa

401814 INVESTICIJE IN INVEST. VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV

4018 – 06 Sofinanciranje opreme in objektov športnih društev

Projekt je realiziran v višini 49 % veljavnega plana. Manjše odstopanje od veljavnega plana nastaja pri investicijskih transferjih neprofitnim organizacijam kamor spadajo stroški razpisa sredstev na področju športa, ki nastaja zaradi tega, ker vsa športna društva niso izpolnila svojih pogodbenih obveznosti.

Področje porabe 19 - IZOBRAŽEVANJE

19039001 Osnovno šolstvo

401907 INVESTICIJE IN VZDRŽEVANJE OBJEKTOV OŠ

4019 – 03 Osnovna šola Tišina – oprema, obnova objekta in igrišč

Projekt je v primerjavi z veljavnim planom realiziran v višini 12.160 EUR. Realizacija projekta se v celoti nanaša na dobavo in montažo Pergotende za teraso v vrtcu »Bibe«, ki je bila potrebna zaradi zagotovitve senčenja otrokom po odstranitvi nevarnih dreves na dvorišču OŠ Tišina).

401916 INVESTICIJE IN INV. VZDRŽ. – ŠPORTNA DVORANA

4019 – 04 Večnamenska športna dvorana s komunalno in prometno ureditvijo

Projekt je realiziran v skupni višini 15.456 EUR oz. tako kot je bil načrtovan. Del realizacije v višini 13.908 EUR se nanaša na stroške priprave projektne dokumentacije za projektiranje fasade v okviru večnamenske športne dvorane. Del realizacije postavke v višini 1.548 EUR pa se nanaša na pripadajočo izplačilo nadomestila stavbne pravice, ki je bila pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Področje porabe 20 - SOCIALNO VARSTVO

20049003 Socialno varstvo starih

402019 INVESTICIJE V DOMOVE ZA STAREJŠE, DNEVNE CENTRE

4020 – 01 Investicije v domove za starejše, dnevne centre

V okviru projekta so v višini 85.000 EUR realizirani stroški nakupa prostora v Poslovno stanovanjskem objektu na Tišini za namen izvajanja dnevnega centra starejših občanov. S tem želimo tudi poskrbeti za potrebe starejših prebivalcev občine Tišina. Ta storitev je tudi cenovno dosegljiva tako za starostnike, kot njihove svojce in ob enem pomeni dodano vrednost bivalnemu okolju občine Tišina. Sama lokacija dnevnega centra je zelo primerna za izvajanje te dejavnosti. Sami prostori pa so po svoji dosedanji namembnosti zelo primerni za to dejavnost. Ustanavljanje takšnih dnevnih centrov je opredeljeno tudi v nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013 – 2020. Gre za usmeritev k skupnostnim obravnavam starejših. S tem pa težnja k ustanavljanju dnevnih centrov za starejše. V bodočnosti se pričakuje povečanje uporabnikov storitve dnevnega varstva.

OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV REŽIJSKEGA OBRATA OBČINE TIŠINA ZA LETO 2017 PO PROJEKTIH

❖ **OSKRBA Z VODO**

Področje porabe 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

16039001 Oskrba z vodo

511602 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VAŠKIH VODOVODOV

5116 – 01 Investicijsko vzdrževanje vaških vodovodov

Projekt ostaja v celoti nerealiziran.

511603 INVESTICIJE IN INV. VZDRŽEVANJE V SKLOPU POMURSKEGA VODOVODA

5116 - 01 Pomurski vodovod – sistem B- ostalo

Realizacija projekta v višini 5.622 EUR se nanaša na plačilo obveznosti občini Grad in sicer še za delež zadržanih oz. neizplačanih sredstev s strani MOP-a. Občina Grad je vsem občinam udeleženim v projektu Pomurski vodovod-sistem B poslala pripadajoče višine zadržanih sredstev oz. neizplačanih sredstev s strani MOP-a (svetovalni inženir, projektiranje), kjer je do sedaj sredstva založila občina Grad. Po prejemu nakazila občine tako pričakujemo vračilo teh sredstev s strani MOP-a.

5116 – 08 Pomurski vodovod-II faza

Realizacija projekta znaša 77 % načrtovanega plana oz. 40.489 EUR realiziranih stroškov. V celoti so bili realizirani stroški položitve novega vodovodnega voda na Krajni v okviru II faze izgradnje. Kot vir financiranja so bila za ta namen porabljena tudi namenska sredstva koncesnin za vodno pravico podjetja Radenska v višini 12.043 EUR.

5116 – 09 Nadgradnja vodovodnega sistema B

Realizacija projekta se nanaša na stroške spremembe projektne dokumentacije za novogradnjo stolpnega vodohrama v okviru projekta »Pomurski vodovod – sistem B – nadgradnja«. Prav tako so realizirani stroški strokovne komisije, ki je proučila ugotovitve inšpektorata na projektu »Pomurski vodovod«.

Nadaljevanje projekta je predvideno v okviru morebitno objavljenega javnega razpisa v okviru »Dogovora Regij«, ki pa je predviden za leto 2018.

POKOPALIŠČA

Področje porabe 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

521603 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČ IN MRLIŠKIH VEŽIC

5216 - 02 Investicije in vzdrževanje mrliških vežic

V sklopu projekta so bili izvedeni stroški nakupa in montaže klimatskih naprav v mrliških vežicah oz. tam kjer še niso bile nameščene. Realizacija projekta se je vršila na podlagi sprejetega sklepa s strani vaše skupnosti na 19. Redni seji dne 03.04.2017. Kot vir financiranja so bila realizirana sredstva s strani posameznih vaških odborov in sicer na

podlagi zbranih prostovoljnih prispevkov ob pogrebih, del pa iz naslova preostanka sredstev za namen delovanja vaških odborov. Razlika pa je bila kot vir financiranja pokrita iz proračuna občine Tišina.

❖ SPLOŠNA KOMUNALA

Področje porabe 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

16039005 Druge komunalne dejavnosti

531602 INVESTICIJE IN OPREMA ZA KOMUNALNO UREJANJE VASI

5316 – 03 Oprema za komunalno vzdrževanje vasi

Realizacija projekta znaša 17.056 EUR oz. 32 % načrtovanega plana. V celoti so bili realizirani stroški za namen nakupa dveh kosilnic na nitko, mulčarja ter ene motorne kosilnice. Do odstopanja pa prihaja na področju nakupa traktorja za vzdrževanja parka na Tišini. V letu 2017 smo izvedli javno naročilo male vrednosti za dobavo traktorja, odločitev je bila pravnomočna, pogodbe je bila sklenjena, rok dobave je bil 27.12.2017. Dobavitelj je podal vlogo za podaljšanje roka dobave iz objektivnih razlogov, vendar zaradi zaključka proračunskega leta aneksa nismo mogli skleniti. Ker je v tem primeru prišlo do objektivno opravičljivih pogodbenih razmerij je bilo potrebno preden pride do podpisa aneksa zagotoviti sredstva v proračunu leta 2018.

❖ KANALIZACIJSKI SISTEM

Področje porabe 15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

541503 INV. IN INVESTICIJSKO VZDRŽ. KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA

5415 – 01 Oprema, snemanje in drugi kanalizacijski investicijski stroški

V sklopu projekta sta bili nabavljeni dve novi črpalke za potrebe nemotenega vzdrževanja kanalizacijskega sistema v občini.

5415 – 18 Širitev kanalizacijskega omrežja

Na področju investicij in investicijskega vzdrževanja kanalizacijskega omrežja so realizirani stroški novih cevovodov na priklop na kanalizacijsko omrežje. V letu 2017 so ti realizirani v višini 21.923 EUR. Režijski obrat občine Tišina je tudi v letu 2017 na predlog NO in na podlagi Odloka o načinu in pogojih o izvajanju občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode na območju občine Tišina nadaljeval z intenzivnimi postopki okrog priklopov nepriklopljenih gospodinjstev na kanalizacijsko omrežje. Izvedenih je tako bilo okrog cca. 20 novih hišnih priključkov. Nadaljevanje projekta je načrtovano tudi v letu 2018.

❖ **SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**

Področje porabe 22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje
Projekt je na podlagi realizacije v letu 2016 evidentiran na naslednjih dveh projektih:

542201 GLAVNICA ZA ODPLAČILO DOLGOROČNEGA KREDITA


5422 – 01 kredit EKO-2002 (kanalizacija)

Odplačilo glavnice kredita EKO Sklada je vključeno v načrt razvojnih programov občine Tišina in je v letu 2017 potekalo na podlagi amortizacijskega načrta v višini 40.472 EUR. Kot vir financiranja je opredeljena okoljska dajatev za obremenjevanje vode v višini 14.386 EUR.

5422 – 02 kredit EKO – 2006 (ČN Murski Črnci)

Prav tako je projekt odplačila EKO Sklada za ČN Murski Črnci najetega v letu 2006 potekal v skladu z amortizacijskim načrtom in je evidentiran v višini 25.162 EUR.

Grafični prikaz načrtovanih in realiziranih projektov v okviru občinske uprave:

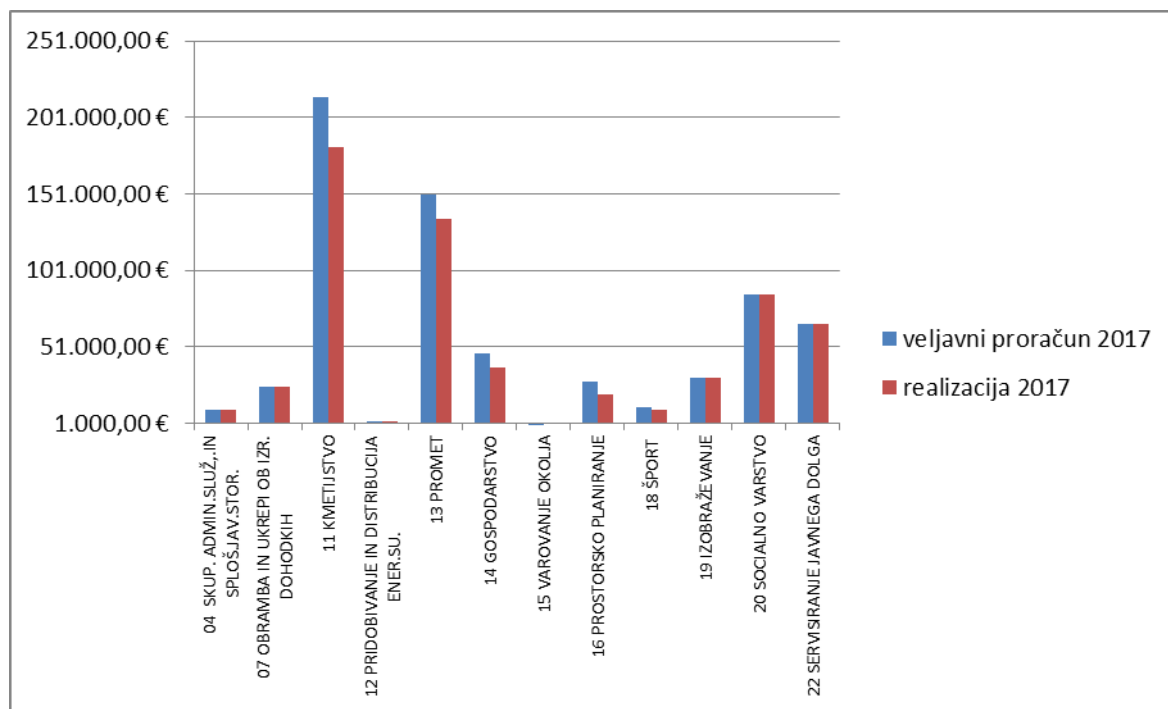

Iz omenjenega grafikona je razvidno, da je največji del planiranih in realiziranih sredstev na področju načrta razvojnih programov pripadal področju kmetijstva za namen izvedbe projekta »agromelioracije«. Sledi področje prometa, kjer so bili v celoti realizirani stroški projekta »Rekonstrukcije lokalne ceste na Krajni-II faza«, sledi področje socialnega varstva, kjer so bili v celoti v načrtovani višini realizirani stroški za namen nakupa prostora v Poslovno stanovanjskem objektu na Tišini. Nekolikšno odstopanje od načrtovanega plana je vidno na področju prostorskega planiranja, kjer niso bili v celoti v načrtovani višini realizirani stroški za namen začetka izvedbenih del v okviru projekta »Trije parki, kulture, miru in oddiha«. Do manjšega odstopanja prihaja tudi na področju gospodarstva na kar pa vplivajo dejanski stroški izvedenega javnega razpisa ter manjša realizacija na področju pridobivanja ustrezne dokumentacije povezane z ureditvijo mejnega prehoda Gederovci, katere del priprave se prenaša v leto 2018.

Na Tišini, v marcu 2018

Pripravila:

Mateja Celec in ostali sodelavci OU in RO

OBČINA TIŠINA



BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2017 - Z OBRAZLOŽITVAMI
