



OBČINA KIDRIČEVO
Kopališka ulica 14
2325 Kidričevo

MODERNIZACIJA JP 666 121 v Dragonji vasi in JP 665 411 v Sp. Jablanah

Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP)

Vsebina je v skladu z 11. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/2006, Spremembe: Ur. l. RS, št. 54/2010, 27/2016).

OSNOVNE INFORMACIJE IN OPREDELITEV POBUDNIKA

1.1 Predstavitev investitorja

INVESTITOR	
Naziv:	Občina Kidričevo
Naslov:	Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo
Odgovorna oseba:	Anton Leskovar
Telefon:	02/799 06 10
Telefaks:	02/799 06 19
E-pošta:	obcina@kidricevo.si
Davčna številka:	SI93796471
Transakcijski račun:	IBAN SI56 0124 5010 0017 097 Banka Slovenije Ljubljana
Odgovorna oseba za izvedbo projekta:	Igor Premužič
Telefon:	02 / 799 06 10
Telefaks:	02 / 799 06 19
E-pošta:	igor.premuzic@kidricevo.si
Odgovorna oseba za izvajanje investicije:	Anton Leskovar
Telefon:	02 / 799 06 10
Telefaks:	02 / 799 06 19
E-pošta:	obcina@kidricevo.si
Žig:	Podpis odgovorne osebe:

1.2 Predstavitev izdelovalca investicijske dokumentacije

IZDELOVALEC INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE	
Naziv:	Občina Kidričevo
Naslov:	Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo
Odgovorna oseba:	Anton Leskovar
Telefon:	02/799 06 10
Telefaks:	02/799 06 19
E-pošta:	obcina@kidricevo.si
Davčna številka:	SI93796471
Transakcijski račun:	IBAN SI56 0124 5010 0017 097 Banka Slovenije Ljubljana
Kontaktna oseba za pripravo investicijskih dokumentov:	Damjan Napast
Telefon:	02 79990610
E-pošta:	Damjan.napast@kidricevo.si
Žig:	Podpis:

1.3 Upravljavec investicije

UPRAVLJAVEC	
Naziv:	Cestno podjetje Ptuj
Naslov:	Zagrebška c. 49a, 2250 Ptuj
Odgovorna oseba:	Turk Martin, izvršni direktor
Telefon:	02/788 08 00
Telefaks:	02/788 08 30
E-pošta:	uprava@cpptuj.si

Davčna številka:	SI 25247506
Transakcijski račun:	SI56 02150-0014061113 pri NLB d.d. SI56 04202-0000292683 pri NKBM d.d. SI56 03182-1000178020 pri SKB banka d.d.
Žig:	Podpis:

2 ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO

TABELA 1: Predstavitev investitorja

Občina Kidričevo je del podravske statistične regije in se razprostira na 72 km². Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 99. mesto. Stopnja registrirane brezposelnosti v občini za mesec december 2016 znaša 9,3 %. Občina ima 2.586 delovno aktivnih prebivalcev in 265 brezposelnih glede na podatke SURS, december 2016. Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo za mesec september 2017 znaša 851,79 €. Na območju občine je registriranih 458 podjetij, ki so ustvarila v letu 2016 629.290.000 € prihodka (SURS, 2016 in 2017).

Občina ima 6.417 prebivalcev (3.110 moških in 3.307 žensk) na dan 1.1.2017. Leta 2017 je na kvadratnem kilometru površine občine živelo povprečno 89,7 prebivalcev, torej je gostota naseljenosti bila manjša kot v celotni državi (101,9 prebivalcev na km²). Povprečna starost občanov za leto 2017 je znašala 44 let in je bila tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (43,1 leta) (SURS 2017).

Občina Kidričevo



V občini je 18 naselij, ki jih prikazujemo v naslednji tabeli s številom prebivalcev in številom gospodinjstev.

Število prebivalcev po naseljih

NASELJE	GOSPODINJSTVA	PREBIVALCI
Apače	304	791
Cirkovce	149	363
Dragonja vas	66	181
Kidričevo	514	1155
Kungota pri Ptuj	153	385
Lovrenc na Dravskem polju	238	638
Mihovce	81	201
Njiverce	264	679
Pleterje	87	224
Pongrce	47	130

Spodnje Jablane	84	274
Spodnji Gaj pri Pragerskem	50	118
Starošince	76	211
Stražgonjca	79	213
Strnišče	45	102
Šikole	114	323
Zgornje Jablane	67	183
Župečja vas	93	246
SKUPAJ	2.511	6.417

TABELA 2: Opis stanja

Občina Kidričevo ima 112,58 km občinskih cest od tega je 49,535 km lokalnih cest in 62,441 km javnih poti ter 1,91 km javnih poti za kolesarje. Državnih cest je 19,88 km od teh predstavljajo 9,25 km glavne ceste in 10,63 km regionalne ceste. Modernizacija JP 666 121 Dragonja vas – Cirkovce v dolžini 600 m in JP 665 411 Sp. Jablane – Medved v dolžini 160 m v skupni dolžini 0,760 km, predstavlja 1,22 % dolžine javnih poti, ki jih ima Občina Kidričevo.

Občina ima še zelo neustrezno vzpostavljeno cestno in drugo javno infrastrukturo, kar se v smislu perspektivnosti življenja mlajše generacije še vedno izkazuje v izseljevanju, kar slabi razvojne možnosti in zaostajanje razvoja gospodarskih dejavnosti.

Tudi v Občini Kidričevo kmetijstvo zaradi mnogih ekonomskih razlogov, ni več edini vir preživljanja podeželskega prebivalstva, zato nekatere kmetije iščejo dodaten vire dohodka, ki ga lahko nudijo dopolnilne dejavnosti. Prav tako pa išče prebivalstvo zaposlitev v industriji, ki je v Občini Kidričevo dobro razvita, in v večjih mestih.

Z dosedanjimi razvojnimi projekti je Občina Kidričevo reševala zlasti infrastrukturno problematiko, s čimer je postopoma odpravljala infrastrukturni zaostanek in izboljševala kakovost življenjskega okolja. Ena od realnih možnosti izboljšanja življenja v občini je razvoj turizma, saj obstaja veliko možnosti ponudb turističnih produktov, turistične in druge znamenitosti, vendar zaradi neugodne cestne povezave, je le-ta bolj kot ne v mirovanju.

Male občine z lastnimi sredstvi ne zmorejo rekonstruirati cest v takšni meri kot bi morale, saj proračun zraven vseh investicij in obveznosti tega ne dopušča, kar je eden od osnovnih dejavnikov ogroženosti občin in regije.

Občinske ceste so še vedno v zelo slabem stanju, ozke, predstavljajo nevarnost za udeležence v prometu, zato je rekonstrukcija nujna.

3 NAVEDBA PREDPISOV

Pravna podlaga za izdelavo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta je Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. 60/06, 54/10, 27/16).

Temeljna pravila pri gradnji, vzdrževanju, obnavljanju in varstvu javnih cest, opredelitvi statusa ter kategorizacije javnih cest, so določena v sprejetih zakonih in podzakonskih aktih.

Zakonski akti, ki s svojimi določbami predstavljajo zakonsko podlago, so naslednji:

- Pravna podlaga za izdelavo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta je Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. 60/06, 54/10, 27/16).

Temeljna pravila pri gradnji, vzdrževanju, obnavljanju in varstvu javnih cest, opredelitvi statusa ter kategorizacije javnih cest, so določena v sprejetih zakonih in podzakonskih aktih.

Zakonski akti, ki s svojimi določbami predstavljajo zakonsko podlago, so naslednji:

- Odlok o proračunu Občine Kidričevo za leto 2021 (Uradno glasilo slovenskih občin, št.);
- Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 38/13, 53/13-popr., št. 22/16);
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 14/07 – ZSPDPO, 27/08-odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10-odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16, odl. US, 11/18 – ZSPDPO-1 in 30/18) v svojem 21. členu določa, da občina samostojno opravlja zadeve javnega pomena. Med nalogami, ki jih opravlja za zadovoljevanje potreb svojih občanov, je tudi gradnja, vzdrževanje in urejanje lokalnih cest ter javnih poti. Občinske ceste (lokalne ceste in javne poti) so namenjene povezovanju naselij v občini z naselji v sosednjih občinah, naselij ali delov naselij v občini med seboj in pomembne za navezovanje prometa na ceste enake ali višje kategorije. Tako so naloge in pristojnosti občine v zvezi z gradnjo, vzdrževanjem, modernizacijo in varstvom občinskih cest ter prometa na njih, podrobneje opredeljene v:
 - Odloku o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za upravljanje rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v Občini Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 47/15);
 - Odloku o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/2019);
 - Odloku o občinskih cestah (Uradni list Republike Slovenije, št. 65/99 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 8/12). Občina Kidričevo z izvedbo predmetne investicije zagotavlja varno odvijanje prometa na tem delu kategorizirane občinske ceste (26. člen Odloka o občinskih cestah). Slabše cestne povezave otežujejo mobilnost na območju občine, zato je investicija s tega vidika pomembna za Občino Kidričevo;
- Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17-popr.);
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-uradno prečiščeno besedilo, 20/06, 28/06-skl. US, 49/06 – ZMetD, 66/06-odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15, 56/15, 102/15, 30/16, 42/16, 61/17 – GZ, 68/17, 21/18 – ZNOrg in 84/18 - ZIURKOE);
- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07-odl. US, 57/08, 94/10 – ZIU, 36/11, 40/12 – ZUJF, 104/12 – ZIPRS1314, 101/13 – ZIPRS1415, 14/15 – ZIPRS1415-D, 14/15 – ZUUJFO, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 in 21/18-popr.);
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19);
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18);
- Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14-odl. US, 46/15 in 10/18);
- Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13-uradno prečiščeno besedilo, 68/16, 54/17 in 3/18-odl. US).

4 OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER USKLAJENOST Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI

Predmet projekta »Modernizacija JP 666 121 Dragonja vas – Cirkovce v dolžini 600 m in širine 5,2 m + 2x 075 m bankine in JP 665 411 Sp. Jablane – Medved v dolžini 160 m in širini 3,5 m + 2x 0,5 m bankine«, je rekonstrukcija javnih pot v skupni dolžini 0,760 km, s katero bodo ustvarjeni pogoji za uresničitev razvojnih ciljev, identificirale se bodo nove priložnosti za razvoj in uveljavitev višje kakovosti življenja podeželskega prebivalstva. Osnovni cilj je rekonstrukcija JP 666 121 Dragonja vas – Cirkovce v Dragonji vasi in JP 665 411 Sp. Jablane – Medved v Spodnjih Jablanah, kjer se bodo izvedle investicije v razširitev vozišča, zgornji in spodnji ustroj ter položil zaključni asfaltni sloj.

Namen investicije je pospešiti skladen družbeni, gospodarski in turistični razvoj ter razvoj z vidika okolja, z zagotavljanjem visoke življenjske ravni in kakovosti zdravja ter bivalnega okolja, s tem dvig življenjskega standarda vseh občanov v Občini Kidričevo. Z investicijo v modernizacijo JP 666 121 Dragonja vas – Cirkovce v

Dragonji vasi in JP 665 411 Sp. Jablane – Medved v Spodnjih Jablanah želimo izboljšati stanje občinske javne infrastrukture.

Cilji načrtovane investicije so:


- zaustavitev depopulacije in »bega možganov« iz Občine Kidričevo, s katerim se bo preprečila nadaljnja stagnacija in upad prebivalstva,
- ustrezna cestna infrastruktura bo podlaga dobrim možnostim za razvoj obrti, kmečkega turizma in drugih dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, s ciljem doseganja večjega dohodka in izboljšanja socialnih razmer kmečkega prebivalstva na tem območju,
- povečati podjetnost in konkurenčnost gospodarstva in družbe ter raven znanj in inovativnosti za hitrejši razvoj urbanih središč in podeželja,
- izboljšati kakovost življenja ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja,
- ustvarjanje pogojev za prostorsko enakomeren demografski in gospodarski razvoj, z uravnovešeno poselitveno strategijo in nadzorovano gradnjo, kar bo privedlo do neke vrste lokalno-regionalno usklajenega prostorskega razvoja, z jasno trajnostno usmeritvijo prihodnjega razvoja občin na območju Dravskega polja in Sp. Podravja,
- urejena in varna cestna infrastruktura bo motivacija tukaj rojenim ljudem za vrnitev v rojstno vas in oživitev njihovih kmetij, ter vlaganje v razvoj turizma in obrti,
- povečala se bo prometna varnost in prehodnost ceste,
- vzpostavil se bo uravnotežen razvoj prometnega sistema z enakomerno razvitimi in povezanimi prometnimi podsistemi s sosednimi občinami in regijami,
- zmanjšali se bodo stroški vzdrževanja ceste za vozišča, bankine, brežin in nasipov, drugih cestnih naprav, vzdrževanje rekonstruirane ceste pa bo tudi lažje in hitrejše,
- izboljšal se bo cestni svet (okoljevarstvena situacija) kot je vegetacija in polje preglednosti, dvig ravni urejenosti okolja,
- ustrezno se bo uredila celostna podoba infrastrukture v Občini Kidričevo in obenem spodbudila uporabnike k ohranitvi kvalitete in dvignila raven odgovornosti do javnega dobra.

5 OPIS VARIANT

Variante niso bile obdelane, možna je le varianta z in brez investicije.

V okviru investicije od Modernizacija JP 666 121 Dragonja vas – Cirkovce in JP 665 411 Sp. Jablane – Medved v Spodnjih Jablanah v skupni dolžini 0,760 km bo izvedeno:

- razširitev vozišča
- obnova ceste v celotni dolžini posega,
- odvodnjavanje vozišča ,
- ureditev vertikalne in horizontalne signalizacije,
- izgradnja vodovoda.

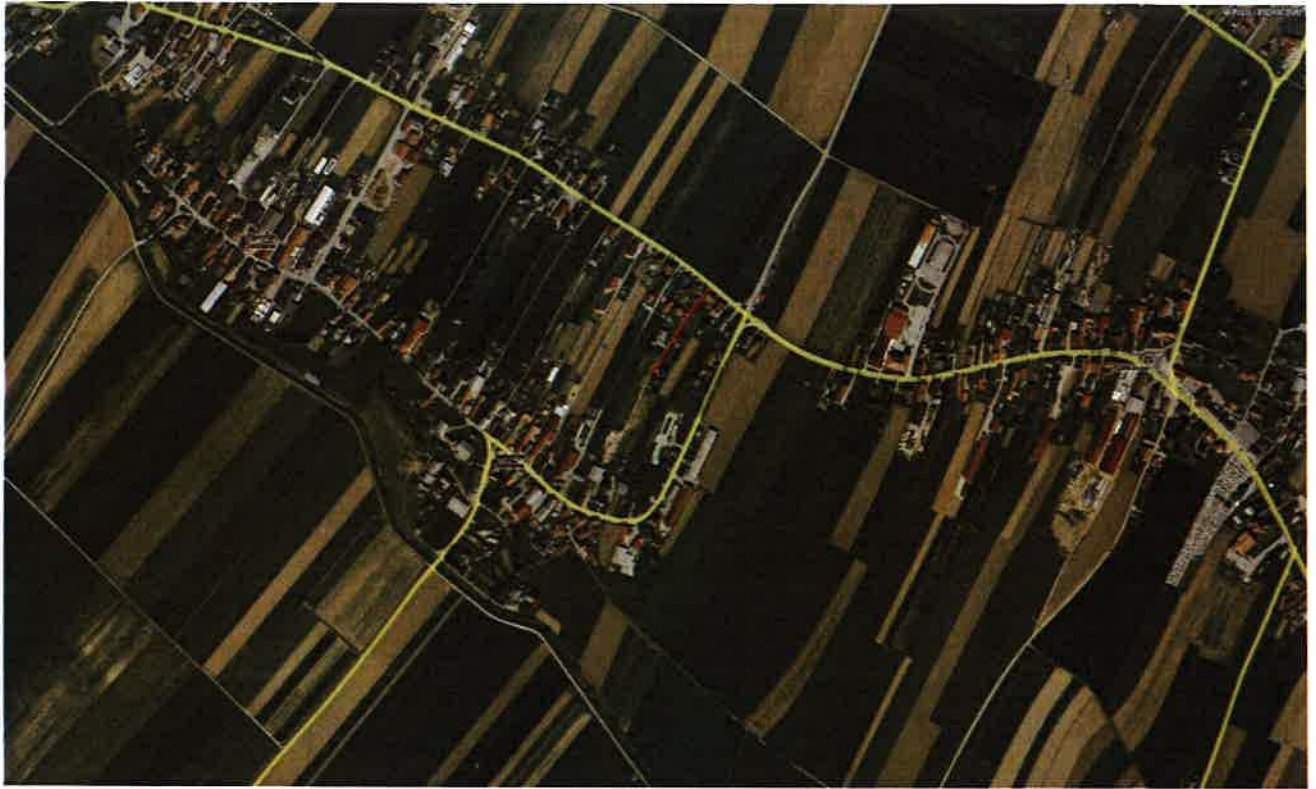

6 VRSTA IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV

Vrsta investicije: investicijska vzdrževalna dela in vzdrževalna dela v javno korist. Ocena investicijske vrednosti je bila izdelana na podlagi naslednjih osnov:

- izvedbeni stroški, kot navedeno v predhodni točki tega dokumenta,
- pod postavko ostalo so zajeti naslednji stroški:
 - o nadzor nad izvedbo v višini 1,0 % od izvedbenih del z nepredvidenimi deli (na neizvedeni del).
- nepredvidena dela so upoštevana v višini 5% od izvedbenih del (neizvedeni del);
- upoštevan je DDV v višini 22%.

7 OPIS PREDVIDENIH DEL ZA IZVEDBO

Oz.	Postavke	Vrednost brez DDV	DDV 22%	Vrednost z DDV
1	Preddela	7.476,00	1.644,72	9.120,72
2	Spodnji ustroj – zemeljska dela	13.541,40	2.979,11	16.520,51
3	Zgornji ustroj	92.893,52	20.436,57	113.330,09
4	Odvodnjavanje	8.885,00	1.954,70	10.839,70
5	Prometna ureditev	1.045,00	229,90	1.274,90
6	Gradbena dela vodovod	3.533,88	777,45	4.311,33
6	Nepredvidena dela v višini 5 %	6.368,74	1.351,42	7.769,86
	Skupaj	133.743,54	29.373,87	163.167,11

8 OSNOVNI DEJAVNIKI, KI DOLOČAJO INVESTICIJO

8.1 Predhodna in spremljajoča dokumentacija

Za predmetno investicijo projektna dokumentacija ni izdelana. DI-IP je bil izdelan na podlagi ocene tovrstnih investicijskih projektov.

8.2 Časovni načrt izvedbe investicije

Oz.	Aktivnost	Terminski načrt
Predinvesticijske aktivnosti		
1	Izdelava DIIP	oktober 2020
2	Javna naročila	December 2020 januar 2021
3	Izbira izvajalca del	februar 2021

Izvedba investicije		
5	Izvedba gradbenih del	marec – julij 2021
6	Financiranje naložbe	leto 2021
7	Tehnični prevzem in pred. v uporabo	julij 2021
8	Obratovanje naložbe	od avgust 2021

8.3 Predvideni viri financiranja

Oznaka	Postavka	Vrednost v letu 2021	Delež (%)
	Lastna sredstva - Občina Kidričevo	163.167,11	100%
2.1	Upravičeni stroški	133.743,53	81,97%
2.2	Neupravičeni stroški	29.423,58	18,03%
1+2	SKUPAJ INVESTICIJSKI STROŠKI	163.167,11	100

8.4 Ekonomska upravičenost projekta

Prihodke – javno korist smo predvideli kot regijski vpliv (regijski in lokalni izvajalci). Dodatno smo predvideli dodatno korist iz naslova povečane varnosti, manj prometnih nesreč, poškodb, izostanka od dela in preprečenega odseljevanja.

Leto	Referenčna leta	Stroški investicije v stalnih cenah (€)	Operativni stroški vzdrževanja (€)	Stroški Skupaj (€)	Prihodki -javna korist (€)	Ostane vrednosti (€)	NETO prihodki (€)	NETO denarni tok (€)	Diskontirano: 4%									
									A	B	A+B	C	E	C+E-B	C+E-B-A	Stroški investicije	NETO prihodki	NETO denarni tok
																A	C+E-B	C+E-B-A
2021	0	163.167	700	163.867	0	0	-700	-163.867	163.167	-700	-163.867							
2022	1		1.350	1.350	16.500	0	15150	15.150	0	14.567	14.567							
2023	2	0	1.350	1.350	16.500	0	15150	15.150	0	14.007	14.007							
2024	3	0	1.350	1.350	16.500	0	15150	15.150	0	13.468	13.468							
2025	4	0	1.350	1.350	16.500	0	15150	15.150	0	12.950	12.950							
2026	5	0	1.350	1.350	16.500	0	15150	15.150	0	12.452	12.452							
2027	6	0	1.350	1.350	16.500	0	15150	15.150	0	11.973	11.973							
2028	7	0	1.350	1.350	16.500	0	15150	15.150	0	11.513	11.513							
2029	8	0	1.350	1.350	16.500	0	15150	15.150	0	11.070	11.070							
2030	9	0	1.350	1.350	16.500	0	15150	15.150	0	10.644	10.644							
2031	10	0	1.350	1.350	16.500	0	15150	15.150	0	10.235	10.235							
2032	11	0	1.350	1.350	16.500	0	15150	15.150	0	9.841	9.841							
2033	12	0	1.350	1.350	16.500	0	15150	15.150	0	9.463	9.463							
2034	13	0	1.350	1.350	16.500	0	15150	15.150	0	9.099	9.099							
2035	14	0	1.350	1.350	16.500	0	15150	15.150	0	8.749	8.749							
2036	15	0	1.350	1.350	16.500	0	15150	15.150	0	8.412	8.412							
2037	16	0	1.350	1.350	16.500	0	15150	15.150	0	8.089	8.089							
2038	17	0	1.350	1.350	16.500	0	15150	15.150	0	7.778	7.778							
2039	18	0	1.350	1.350	16.500	0	15150	15.150	0	7.478	7.478							
2040	19	0	1.350	1.350	16.500	0	15150	15.150	0	7.191	7.191							
2041	20	0	1.350	1.350	16.500	0	15150	15.150	0	6.914	6.914							
2042	21	0	1.350	1.350	16.500	0	15150	15.150	0	6.648	6.648							
2043	22	0	1.350	1.350	16.500	0	15150	15.150	0	6.393	6.393							
2044	23	0	1.350	1.350	16.500	0	15150	15.150	0	6.147	6.147							
2045	24	0	1.350	1.350	16.500	0	15150	15.150	0	5.910	5.910							
2046	25	0	1.350	1.350	16.500	0	15150	15.150	0	5.683	5.683							
2047	26	0	1.350	1.350	16.500	0	15150	15.150	0	5.464	5.464							
2048	27	0	1.350	1.350	16.500	0	15150	15.150	0	5.254	5.254							
2049	28	0	1.350	1.350	16.500	0	15150	15.150	0	5.052	5.052							
2050	29	0	1.350	1.350	16.500	0	15150	15.150	0	4.858	4.858							
2051	30	0	1.350	1.350	16.500	0	15150	15.150	0	4.671	4.671							
Skupaj		163.167	41.200	204.367	495.000	0	453.800	290.633	163.167	261.274	98.107							
Skupaj diskontirano		163.167	24.044	187.211	285.319	0	261.274	98.107										
Neto ekonomska sedanja vrednost investicije					98.107,19 €													
Ekonomska stopnja donosnosti EIRR				4,26%														

Ekonomska neto sedanja vrednost projekta je pozitivna in znaša 98.107,19 €. Ekonomska interna stopnja donosnosti znaša 4,26 % in je večja od družbene diskontne stopnje 4 %. Ker so stroški investicije nižji od ekonomskih koristi, je projekt družbeno sprejemljiv.

9 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI IZDELAVE NADALJNJE DOKUMENTACIJE

Investicijska in ostala dokumentacija

Za potrebe izvedbe celotne investicije je na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS, št. 60/2006, 54/2010, 27/2016) potrebno izdelati naslednjo dokumentacijo:

- Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP),

- Izvesti postopke javnega naročanja.

V skladu s 4. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS, št. 60/2006, 54/2010, 27/2016) ni potrebno pripraviti druge investicijske dokumentacije.

Smiselnost investicije

V dokumentu identifikacije investicijskega projekta predstavljamo Modernizacijo JP 666 121 Dragonja vas – Cirkovce in JP 665 411 Sp. Jablane – Medved v Spodnjih Jablanah v skupni dolžini 0,760 km . Z modernizacijo predmetne javne poti se bo povečala varnost v cestnem prometu v občini. Omogočili bomo lažji in varnejši prevoz prebivalstva, šolo-obveznih otrok. Izboljšale se bodo transportne povezave industrije in malega gospodarstva, predvsem do podjetij. Z investicijo bomo prispevali k boljšim prometnim povezavam in mobilnosti prebivalstva iz ruralnih okolij z občinskim središčem in širše, razvoju gospodarstva, turizma in turističnih kmetij v okolici.

Z Dokumentom identifikacije investicijskega projekta se ugotavlja, da je investicija za nadaljnji razvoj območja nujno potrebna.

OBČINA KIDRIČEVO
Odbor za gospodarsko
infrastrukturo

Številka: 011-6/2019-32-3
Datum: 1.12.2020

Na podlagi 22. člena Statuta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62/16 in 16/18) in 59. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/17 in 16/18) je Odbor za gospodarsko infrastrukturo na svoji 3. korespondenčni seji odbora, ki je potekala od dne 26.11.2020 do 30.11.2020 do 20.00 ure, sprejel naslednji

SKLEP

Odbor za gospodarsko infrastrukturo potrjuje DIIP-Modernizacija JP 666 121 v Dragonji vasi in JP 665 411 v Sp. Jablanah, in predlaga Občinskemu svetu Občine Kidričevo, da ga po obravnavi na svoji seji potrdi.

Danilo Lendero l.r.
predsednik
Odbora za gospodarsko infrastrukturo
