



OBČINA MAJŠPERK

K 5. točki dnevnega reda:

- Sklep o potrditvi DIIP-a za projekt
»Večnamenski objekt Naraplje«**

SKLEP O POTRĐITVI INVESTICIJSKEGA DOKUMENTA

Investitor: OBČINA MAJŠPERK
Naslov: Majšperk 39, 2322 Majšperk
Oznaka (številka, šifra) sklepa:
Datum sklepa:

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/211-ZJF-UPB4 in 110/11-ZDIU12), Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07 in 54/10), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/06 in 54/10) in Statuta Občine Majšperk (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25/12) je občinski svet dne _____ s sklepom št: _____ sprejel:

1. Potrđi se Dokument identifikacije investicijskega projekta za projekt/program: VEČNAMENSKI OBJEKT NARAPLJE, ki ga je izdelala OBČINA MAJŠPERK, Majšperk 39, 2322 Majšperk januarja 2015.

2. Dokument je pregledal (recenzent) _____ oz. strokovna komisija za oceno investicij, _____, ki je dne _____ izdelala strokovno oceno o upravičenosti investicije¹.

3. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 134.857,54 EUR (z vključenim DDV) in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od januarja 2015 do septembra 2017.

4. Vire za financiranje zagotavljajo:
- OBČINA MAJŠPERK v znesku 134.857,54 EUR

5. V NRP občine / države se spremeni veljavni projekt.

6. Odobri se
 priprava Predinvesticijske zasnove
 priprava Investicijskega programa
 izvedba investicije.

Odgovorna oseba investitorja:
Ime in priimek: dr. Darinka Fakin
Funkcija: županja Občine Majšperk

Podpis: _____

¹ Samo za IP in PIZ



OBČINA MAJŠPERK

Majšperk 39, 2322 Majšperk

Tel.: 02/795 08 30, faks: 02/794 42 21

e-pošta: obcina.majsperk@majsperk.si, www.majsperk.si

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

(Po Uredbi o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ

– Uradni list RS, št. 60/2006 in 54/2010)

VEČNAMENSKI OBJEKT NARAPLJE

Majšperk, Januar 2015

Županja: dr. Darinka FAKIN

Naziv investicijskega projekta:
VEČNAMENSKI OBJEKT NARAPLJE

Investitor:

**OBČINA MAJŠPERK
MAJŠPERK 39
2322 MAJŠPERK**

Odgovorna oseba investitorja (ime, priimek, podpis in žig):

dr. Darinka FAKIN, županja

Skrbnik investicijskega projekta (ime, priimek, podpis in žig):

Gorazd LADINEK, direktor občinske uprave Občine Majšperk

Izdelovalec investicijske dokumentacije (ime, priimek, podpis in žig):

**OBČINA MAJŠPERK
MAJŠPERK 39
2322 MAJŠPERK**

Matic ŠINKOVEC, višji svetovalec za vodenje projektov

Upravljavec objekta (ime, priimek, podpis in žig):

**OBČINA MAJŠPERK
MAJŠPERK 39
2322 MAJŠPERK**

dr. Darinka FAKIN, županja

KAZALO

1	NAVEDBA INVESTITORJA IN IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE, UPRAVLJAVCA TER STROKOVNIH SODELAVCEV	7
1.1	Navedba investitorja	7
1.2	Navedba izdelovalca investicijske dokumentacije	8
1.3	Navedba upravljavca	8
1.4	Datum izdelave DIIP	8
2	ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO.....	9
2.1	Predstavitev Občine Majšperk.....	9
2.2	Pregled in analiza obstoječega stanja	11
2.3	Temeljni razlogi za investicijsko namero	11
3	OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI.....	12
3.1	Predmet projekta z opredelitvijo vpliva na razvojne možnosti regije	13
3.1.1	Predmet projekta.....	13
3.1.2	Namen projekta	13
3.2	Ugotovitev ciljev investicije	13
3.3	Ugotovitev pomena investicije v smislu razvojnih možnosti in strategij	14
3.4	Usklajenost predmetnega projekta z razvojnimi strategijami in politikami.....	14
3.4.1	Usklajenost s Strategijo razvoja Slovenije.....	14
3.4.2	Usklajenost s Strategijo razvoja Občine Majšperk	15
3.4.3	Usklajenost z Državnim razvojnim programom Republike Slovenije za obdobje 2007-2013	15
3.4.4	Usklajenost z operativnimi razvojnimi programi	16
3.4.5	Usklajenost z Regionalnim razvojnim programom za podravsko regijo 2007-2013.....	16
3.4.6	Usklajenost z nacionalnim strateškim načrtom razvoja podeželja.....	17
3.5	Zakonodaja, ki ureja predmetno področje	17

4 OPIS VARIANTE »Z« INVESTICIJO, PREDSTAVLJENIH V PRIMERJAVI Z ALTERNATIVO »BREZ« INVESTICIJE IN/ALI MINIMALNO ALTERNATIVO	19
4.1 Varianta »brez« investicije	19
4.2 Varianta »z« investicijo.....	19
5 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE	21
5.1 Opredelitev osnovnih tehnično-tehnoloških rešitev v okviru operacije.....	21
6 OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV	22
6.1 Ocena celotnih investicijskih stroškov po stalnih cenah	22
6.1.1 Terminski plan glede vrste stroškov po stalnih cenah	22
6.2 Ocena celotnih investicijskih stroškov po tekočih cenah	23
6.2.1 Terminski plan glede vrste stroškov po tekočih cenah	24
7 TEMELJNE PRVINE, KI DOLOČAJO INVESTICIJO	25
7.1 Predhodna idejna rešitev ali študija	25
7.2 Opis in grafični prikaz lokacije.....	25
Slika 7/2: Ureditvena situacija.....	26
7.3 Obseg in specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe.....	30
7.4 <i>Varstvo okolja</i>	32
7.4.1 Učinkovita izraba naravnih virov	32
7.4.2 Okoljska učinkovitost.....	32
7.4.3 Trajnostna dostopnost.....	32
7.4.4 Zmanjšanje vplivov na okolje.....	32
7.4.5 Hrup.....	33
7.4.6 Ukrepi za odpravo negativnih vplivov na okolje.....	33
7.5 <i>Ocena stroškov za odpravo negativnih vplivov</i>	33
7.6 Kadrovska organizacijska shema s prostorsko opredelitvijo	34
7.1 Predvideni viri financiranja po tekočih cenah.....	40
7.2 Pričakovana stopnja izrabe zmogljivosti oziroma ekonomska upravičenost projekta	40

• ZMANJŠANJE ONESNAŽEVANJA OKOLJA Z ODPADLIMI DELI DOTRAJANE STAVBE.....	40
8 ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI TER DOLOČITEV NEPOVRATNE POMOČI.....	41
8.1 Finančna analiza.....	41
8.1.1 Projekcija operativnih stroškov	41
8.1.2 Neto sedanja vrednost in interna stopnja donosa pri finančni analizi	43
8.2 Ekonomska analiza in denarni tok	44
8.2.1 Projekcija prihodkov – javno dobro.....	44
8.2.2 Preglednica investicije, prihodkov in stroškov – ekonomska analiza.....	46
8.2.3 Neto sedanja vrednost in interna stopnja donosa pri ekonomski analizi.....	48
8.2.4 Izračun ekonomske upravičenosti operacije z jasno opredeljenimi izhodišči.....	49
8.3 Analiza občutljivosti in tveganj	50
8.3.1 Splošna analiza občutljivosti	50
9 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM.....	51
9.1 Potrebna investicijska dokumentacija.....	51
9.2 Smiselnost investicije.....	52
10 PRIKAZ REZULTATOV OCENJEVANJA Z UTEMELJITVIJO UPRAVIČENOSTI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA	53

1 NAVEDBA INVESTITORJA IN IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE, UPRAVLJAVCA TER STROKOVNIH SODELAVCEV

1.1 Navedba investitorja

INVESTITOR	
Naziv:	OBČINA MAJŠPERK
Naslov:	MAJŠPERK 39, 2322 MAJŠPERK
Odgovorna oseba:	Županja dr. Darinka FAKIN
Telefon:	02/ 795 08 30
Telefaks:	02/ 794 42 21
E-pošta:	obcina.majsperk@majsperk.si
ID za DDV:	SI11993197
Transakcijski račun:	SI56 0126 9010 0017 182 Banka Slovenije
Odgovorna oseba za pripravo investicijskih dokumentov:	Gorazd LADINEK, direktor občinske uprave
Telefon:	02/ 795 08 30
Telefaks:	02/ 794 42 21
E-pošta:	gorazd.ladinek@majsperk.si
Odgovorna oseba za izvajanje investicije:	dr. Darinka FAKIN, županja
Telefon:	02/ 795 08 30
Telefaks:	02/ 794 42 21
E-pošta:	zupanja@majsperk.si

1.2 Navedba izdelovalca investicijske dokumentacije

IZDELOVALEC INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE	
Naziv:	OBČINA MAJŠPERK
Naslov:	MAJŠPERK 39 2322 MAJŠPERK
Odgovorna oseba:	Županja dr. Darinka FAKIN
Telefon:	02/ 795 08 30
Telefaks:	02/ 794 42 21
E-pošta:	obcina.majsperk@majsperk.si
Davčna številka:	SI11993197
Transakcijski račun:	SI56 0126 9010 0017 182 Uprava RS za javna plačila
Odgovorna oseba za pripravo investicijskih dokumentov:	Matic ŠINKOVEC
Telefon:	02/ 795 08 30
Telefaks:	02/ 794 42 21
E-pošta:	matic.sinkovec@majsperk.si

1.3 Navedba upravljavca

UPRAVLJAVEC OBJEKTA	
Naziv:	OBČINA MAJŠPERK
Naslov:	MAJŠPERK 39, 2322 MAJŠPERK
Odgovorna oseba:	Županja dr. Darinka FAKIN
Telefon:	02/ 795 08 30
Telefaks:	02/ 794 42 21
E-pošta:	obcina.majsperk@majsperk.si
ID za DDV:	SI11993197
Transakcijski račun:	SI56 0126 9010 0017 182 Banka Slovenije

1.4 Datum izdelave DIIP

Datum izdelave DIIP-a:

JANUAR 2015

2 ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO


2.1 Predstavitev Občine Majšperk

Občina Majšperk je bila ustanovljena 01. 01. 1995 v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi. Leži na zahodnem delu Haloz. Občina meji na Občino Kidričevo, Slovensko Bistrico, Makole, Rogaško Slatino, Rogatec, Žetale in Videm. Središče Občine Majšperk je naselje Majšperk, ki leži 16 km jugozahodno od mesta Ptuj.

Občina sestoji iz naselij: Bolečka vas, Breg, Doklece, Dol pri Stopercah, Grdina, Janški Vrh, Jelovice, Koritno, Kupčinji Vrh, Lešje, Majšperk, Medvedce, Naraplje, Planjsko, Podlože, Preša, Ptujška Gora, Sestrže, Sitež, Skrblje, Slape, Spodnja Sveča, Stanečka vas, Stogovci, Stoperce in Zgornja Sveča.

Površina: 72,8 km²

Prebivalci: 3.935 ¹

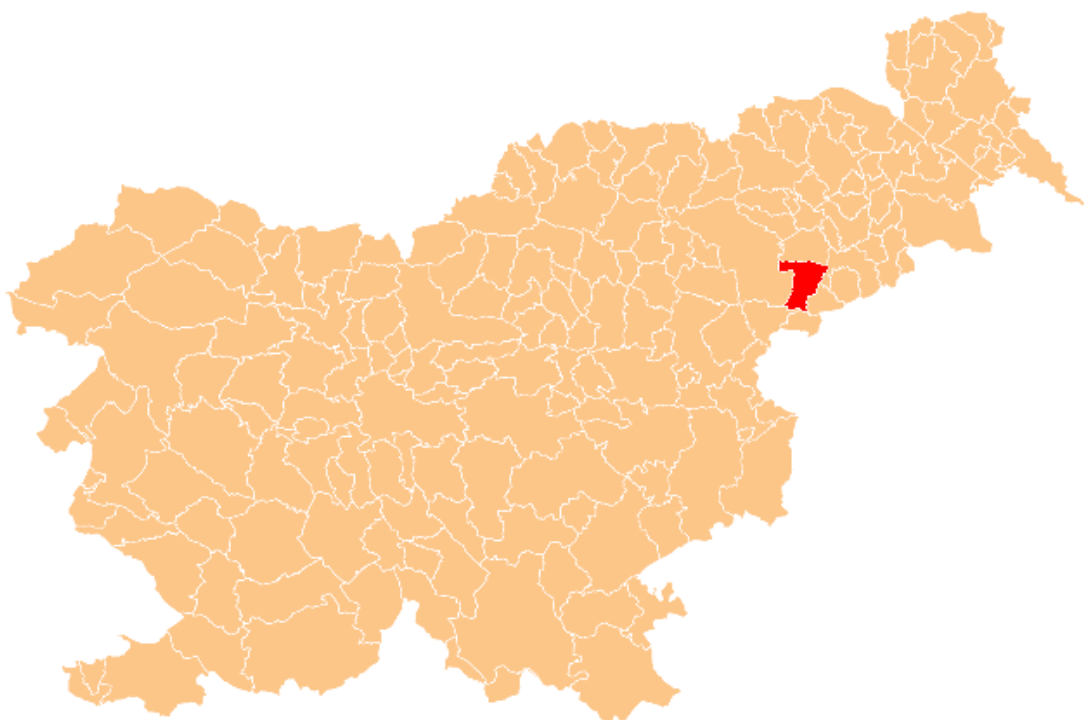

Občina Majšperk leži ob robu široke doline, po kateri teče reka Dravinja. Na vzhodni in južni strani ga obdajajo zelena pobočja Haloz, na severni in zahodni strani pa relativno nizko

¹ Vir: Statistični urad RS, podatki na dan 31. 7. 2014.

gričevje Savinskega, ki deli Dravinjsko dolino od Dravskega polja. Kraj Majšperk je dobil ime pred več stoletji po mogočnem gradu, ki se je vzpenjal nad vasjo. Zgodovinski viri se dotikajo Majšperka že v 12. stoletju, ko se omenja grad Monsberg, kot je bilo ime tudi kraju že leta 1168. Že v zgodovini je bil Majšperk pomemben v gospodarskem, predvsem pa v strateškem pogledu, saj je bil v sestavi obrambnega pasu, ki je bil usmerjen proti napadalnosti ogrskih kraljev.

Zanimivo je ugotoviti, da se je mudil na gradu Monsberg pri Hartmanu Holleneškem in njegovi ženi Amaliji leta 1487 tudi potopisec Paolo Santonino. Leta 1695 so grad požgali uporni kmetje. Grad so sicer ponovno pozidali, vendar je po letu 1850 začel naglo propadati. Danes je ohranjen le še del obrambnega stolpa. Med pomembnejše mejnike v zgodovini Majšperka spada prav gotovo iniciativa družin Novak in Kubricht, ki sta zagotovili razvoj industrije v tem kraju, kjer so bile ugodne surovinske okoliščine in kjer je bilo na razpolago dovolj delovne sile, ki na tem revnem hribovitem področju okrog Majšperka dotlej ni našla dovolj možnosti za zaslužek. Tega jim je zagotovila najprej tovarna strojil, pozneje pa še zlasti ženski delovni sili-tovarna tekstila. Obe tovarni pod drugačnimi imeni obratujeta še danes.

V Majšperku obstaja šola že od 1803 leta.

Med znamenitostmi Majšperka moramo omeniti grad na Hamrah (današnji Breg pri Majšperku). V gradu je bila tudi kapela, posvečena Sv. Janezu Nepomuku, ki je bila po zadnji vojni opuščena. V centru Majšperka je cerkev Sv. Miklavža, ki je obstajala že pred letom 1261. Na vrhu slemena Jelovic stoji podružnična cerkev Sv. Bolfenka iz leta 1649. V Majšperku je postavljen spomenik žrtvam 2. svetovne vojne.

Občina ima danes zdravstveni dom, šolo, lekarno, vrtec, policijsko pisarno, banko in pošto.

Za kulturne prireditve v Občini Majšperk poskrbijo številna društva, Osnovna šola Majšperk s podružnicama Stoperce in Ptujška Gora ter vrtec.

2.2 Pregled in analiza obstoječega stanja

Naselje Naraplje se nahaja na desnem bregu reke Dravinje ob pritoku Jesenica. Po številu prebivalcev šteje med redkeje naseljene v Občini Majšperk. Pomembna lastnost Narapelj so društvene dejavnosti na področju kulture in turizma. Naselje sestavljajo okoliški griči bogati z vinogradi in sadovnjaki, obnovljen vaški mlin na potoku Jesenica in poligon orientacijskega teka, kar naselju zagotavlja turistično, kulturno in družabno osnovo.

V naselju stoji stavba Osnovne šole Naraplje, ki je v zelo slabem stanju in ne služi več svojemu namenu. Stavbo je potrebno porušiti, na njenem mestu pa želimo zgraditi manjši večnamenski objekt, ki bi služil za dejavnosti kulture, turizma in druge društvene dejavnosti.

Investicija se bo izvajala na parcelni št. 99/4 k.o. Sitež v lasti Občine Majšperk.

2.3 Temeljni razlogi za investicijsko namero

Temeljni razlogi za investicijsko namero so:

- Implementacija evropskih in nacionalnih programov in strategij;
- Implementacija Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov;
- Implementacija Nacionalnega strateškega referenčnega okvirja (NSRO);
- Implementacija Državnega razvojnega programa (DRP);
- Implementacija Strategije razvoja Slovenije (SRS).
- Implementacija Strategije razvoja Občine Majšperk

Zaradi potreb po prostorih za razvoj društev, kulture in turizma v naselju Naraplje, ki jih ni mogoče zagotoviti na noben drug način, je potrebno preiti v rušitev dotrajane osnovne šole in izgradnjo manjšega večnamenskega objekta nad kletno ploščo, ki bo služil društvom za dejavnosti kulture in turizma.

3 OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI

Planirana investicija je predvidena v naslednjih programih in načrtih:

- v proračunu Občine Majšperk za leto 2015 in
- v Načrtu razvojnih programov Občine Majšperk 2015-2018.

Izgradnja večnamenskega objekta je v skladu z:

1. Operativnim programom krepite regionalnih razvojnih potencialov (OP RR).
2. Nacionalnim strateškim referenčnim okvirjem (NSRO).
3. Nacionalni strateški načrt razvoja podeželja (NSNRP).
4. Strategijo razvoja Občine Majšperk.

1. Operativni program krepite regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 predstavlja skupni programski dokument Slovenije in EU, ki je sprejet na predlog države članice, po uskladitvi z Evropsko komisijo.

OP RR najširše temelji na Strategiji razvoja Slovenije ter na njem temelječih strateških dokumentov za izvajanje kohezijske politike EU v Sloveniji. Načrt priprave DRP predvideva, da dokument lahko služil kot strokovna podlaga za pripravo Nacionalnega strateškega referenčnega okvirja.

2. Nacionalni strateški referenčni okvirja predstavlja osnovo za pripravo Državnega razvojnega programa 2007-2013.

DRP predstavlja instrument za uresničevanje Strategije razvoja Slovenije na področju razvojno-investicijskih programov in projektov, NSRO pa predstavlja njegovo podmnožico, pri čemer je ključnega pomena, da je zagotovljen strateški pristop z jasno in konsistentno pripravljenimi programi in instrumenti.

Zaradi ciljev je SRS po svoji vsebini tudi strategija trajnostnega razvoja Slovenije, hkrati pa pomeni prenos ciljev Lizbonske strategije v nacionalno okolje.

3. Nacionalni strateški načrt razvoja podeželja (NSNRP) opredeljuje prednostne naloge na področju politike razvoja podeželja. Prednostne naloge so zasnovane v skladu s prednostnimi nalogami Skupnosti na področju politike razvoja podeželja. Prednostne naloge NSNRP bodo prispevale tudi k ekonomski in socialni kreptvi podeželja.

4. Strategija razvoja občine je eden od dolgoročnih planskih dokumentov, ki je osnova za njen gospodarski, prostorski in družbeni razvoj. Služi občinskemu svetu in županji za izdelavo ter sprejem Načrta občinskih razvojnih programov in vsakoletno proračunsko financiranje, pa tudi podjetjem in organizacijam za oblikovanje konkretnih poslovnih načrtov.

3.1 Predmet projekta z opredelitvijo vpliva na razvojne možnosti regije

3.1.1 Predmet projekta

Predmet projekta »VEČNAMENSKI OBJEKT NARAPLJE« je rušitev stavbe OŠ Naraplje in izgradnja novega večnamenskega objekta. Potrebno je:

- porušiti dotrajano stavbo,
- zaščititi ploščo nad kletjo in jo pripraviti za nadzidavo objekta,
- zgraditi nov večnamenski objekt in
- urediti okolico objekta in parkirišče.

3.1.2 Namen projekta

Osnovni namen Občine Majšperk je z izvedbo predmeta projekta:

- zagotoviti možnost razvoja dejavnosti društev s področja kulture in turizma in
- izpolniti zaveze iz Strategije razvoja Občine Majšperk.

3.2 Ugotovitev ciljev investicije

Naselje Naraplje ima na območju gradnje športno igrišče z razsvetljavo in zunanji prostor za druženje in pogostitev turističnih skupin, ki si ogledujejo vaški mlin ali se pomerijo v orientacijskem teku. Športno igrišče se nahaja na isti parceli kot objekt OŠ Naraplje in kjer bo kasneje stal nov večnamenski objekt. Okolico objekta bomo uredili s parkiriščem in zasaditvijo, kar bo območju dalo lep izgled. Parcela št. 499, k.o. Sitež je v velikosti 2820 m² in je v celoti v lasti občine Majšperk.

Cilj ureditve je:

- porušiti dotrajan objekt do kletne plošče,
- zaščititi kletno ploščo površine 59,25 m²
- izgradnja novega objekta površine 126,65 m² - pritličje in 101,05 m² - mansarda,
- opremiti klet in objekt za namene društev,
- ureditev parkirišča za 7 vozil in

- ureditev in zasaditev okolice objekta.

3.3 Ugotovitev pomena investicije v smislu razvojnih možnosti in strategij

Investicija »VEČNAMENSKI OBJEKT NARAPLJE« je skladna s Strategijo razvoja Občine Majšperk, z območnim razvojnim programom Spodnjega Podravja za obdobje 2007-2013 ter z operativnim razvojnim programom Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013.

Prioriteta projekta je skladna s Strategijo razvoja Slovenije, saj je cilj projekta **dvigniti ter povečati kakovost bivanja**.

Prioriteta projekta je skladna z Ukrepi za izboljšanje kakovosti življenja na podeželju, tretje osi v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije v obdobju 2007-2013.

S cilji h katerim strmi projekt in jih bo z realizacijo dosegel, investicija sovpada z razvojnimi možnostmi in strategijami.

3.4 Usklajenost predmetnega projekta z razvojnimi strategijami in politikami

Projekt »VEČNAMENSKI OBJEKT NARAPLJE« je usklajen z razvojnimi strategijami:

- Strategija razvoja Slovenije (Ljubljana, 2005);
- Strategija razvoja Občine Majšperk (Majšperk, 2011);
- Državni razvojni program Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 (DRP, februar 2008);
- Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 (Ljubljana 16. februar 2007);
- Regionalni razvojni program za Podravsko razvojno regijo 2007-2013, maj 2007;
- Nacionalni strateški načrt razvoja podeželja (Ljubljana, junij 2007);
- Programom razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 (MKGP, julij 2007).

3.4.1 Usklajenost s Strategijo razvoja Slovenije

Strategija razvoja Slovenije opredeljuje vizijo in cilje razvoja Slovenije ter pet razvojnih prioritet z akcijskimi načrti: konkurenčno gospodarstvo in hitrejša gospodarska rast, učinkovito ustvarjanje, dvosmerni pretok in uporaba znanja za gospodarski razvoj in kakovostna delovna mesta, učinkovita in cenejša država, moderna socialna država in večja zaposlenost ter povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja.

Predmetni projekt je skladen predvsem s peto razvojno prioriteto »moderna socialna država«, saj je osnovni namen izgradnje infrastrukture prav socialna povezanost in medgeneracijsko druženje, kar je temelj moderne socialne države. Projekt je delno v skladu tudi z ostalimi prioriteta, predvsem pa z osnovnim ciljem Strategije razvoja Slovenije, ki je investiranje v finančni ali fizični kapital ne le v gospodarskem smislu, ampak tudi vlaganje v okoljski in družbeni kapital. Slednji vključuje kategorije človeškega kapitala, socialnega kapitala in kulturnega kapitala.

3.4.2 Usklajenost s Strategijo razvoja Občine Majšperk

Strategija razvoja Občine Majšperk, ki jo je Občinski svet Občine Majšperk sprejel na 12. redni seji leta 2011 je eden od dolgoročnih planskih dokumentov, ki je osnova za gospodarski, prostorski in družbeni razvoj občine. Služi občinskemu svetu in županji za izdelavo ter sprejem Načrta občinskih razvojnih programov in vsakoletno proračunsko financiranje, pa tudi podjetjem in organizacijam za oblikovanje konkretnih poslovnih načrtov. Ključnega pomena pri pripravi strategije razvoja občine je bilo sodelovanje lokalne javnosti (strokovnjaki, interesne skupine in ostali deležniki), saj le tako strategija odgovarja na težnje lokalnega okolja.

Namen strategije razvoja občine je na enem mestu zbrati smernice za nadaljnji razvoj občine na vseh področjih (gospodarstvo, okolje in prostor...), pri čemer so upoštevane želje prebivalcev občine, nekateri že izvedeni projekti, Regionalni razvojni program, Strategija razvoja Slovenije z Državnim razvojnimi programom, Strategija prostorskega razvoja Slovenije ter usmeritve v Evropski uniji in svetu.

Predmetna naložba je skladna s cilji na področju:

- Komunalne dejavnosti, stanovanja in poslovni prostori, strateškim ciljem »Dvig privlačnosti za priseljevanje«,
- Kultura in društvena dejavnost, strateškimi cilji »Skrb za bogato društveno dejavnost«, »Ohranjanje kulturne dediščine in običajev«, »Zagotovitev ustreznih prostorskih in finančnih pogojev za kulturne in društvene dejavnosti« in »Ustanovitev centra za informiranje in podporo turizmu« in
- Zdravstvo, socialno varstvo, vzgoja in izobraževanje ter šport, strateškim ciljem »Skrb za bogato kulturno in društveno dejavnost«.

3.4.3 Usklajenost z Državnim razvojnimi programom Republike Slovenije za obdobje 2007-2013

DRP je izvedbeni dokument razvojnega načrtovanja. Sprejete strateške usmeritve in razvojne prioritete operativno razdeli na indikativno finančno ovrednotene programe, pri čemer upošteva oziroma zajame tudi vse druge dokumente razvojnega načrtovanja, ter za njih predvidi tudi ustrezne (nacionalne in mednarodne, javne in zasebne) vire financiranja. Je

instrument za prevedbo strateških usmeritev v konkretne in s proračunskimi možnostmi skladne razvojno-investicijske programe.

Projekt v svoji osnovi, to je dokument identifikacije investicijskega projekta, v celoti zasleduje strateške usmeritve DRP, s svojo osnovo v občinskem proračunu in načrtu razvojnih programov za leta 2015-2018 pa projekt zaključuje svojo finančno konstrukcijo, ko lahko preide v fazo izvedbe. Predmetni projekt je skladen predvsem s peto razvojno prioriteto »Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja«, s ciljem spodbujanja skladnega regionalnega razvoja, razvoja podeželja in ribištva, krepitvi prehranske varnosti ter izboljšanju kakovosti življenja v urbanih in podeželskih območjih.

3.4.4 Usklajenost z operativnimi razvojnimi programi

Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013 v okviru razvojne prioritete Razvoj regij pri podeželskih območjih spodbuja ukrepe k podpiranju gospodarskega obnavljanja podeželskih območij s prispevanjem k zagotavljanju ustrezne ravni dostopnosti do storitev splošnega gospodarskega interesa za izboljšanje pogojev na podeželskih območjih, ki so potrebni za pridobitev podjetij in usposobljenega osebja in za omejevanje selitve prebivalstva s podeželja. Potrebna je tudi povezanost z glavnimi nacionalnimi in evropskimi omrežji ter podpora endogenih potencialov podeželskih območij (npr. za razvoj turizma). Ukrepi morajo izkoristiti in si prizadevati za ohranitev naravnih in kulturnih dobrin, kar lahko prinese pomembne pozitivne učinke pri varovanju habitatov in ohranjanju biotske raznovrstnosti. Cilj pristopa je pozitiven vpliv na turistični sektor, lokalno gospodarstvo, delavce v turističnem sektorju, obiskovalce in lokalno prebivalstvo, na ohranitev biotske raznovrstnosti in kulturne dediščine ter na prepoznavnost prostora.

3.4.5 Usklajenost z Regionalnim razvojnim programom za podravsko regijo 2007-2013

Regionalni razvojni program je temeljni programski dokument na regionalni ravni, ki opredeljuje razvojne prednosti razvojne regije, določi razvojne prioritete regije in vsebuje finančno ovrednotene programe spodbujanja razvoja v razvojni regiji. Regionalni razvojni program za Podravsko razvojno regijo predstavlja dogovor med 41 občinami Podravske razvojne regije in Vlado RS o razvoju Podravske razvojne regije v programskem obdobju 2007-2013.

Projekt je skladen s:

Prioriteto 3 – Trajnostni razvoj

- Programom 13 - Večja dostopnost do javne infrastrukture in javnih storitev, Ukrepom 13.6. – Zagotavljanje dostopnosti do javne kulturne in turistične infrastrukture.

3.4.6 Usklajenost z nacionalnim strateškim načrtom razvoja podeželja

Nacionalni strateški načrt razvoja podeželja opredeljuje prednostne naloge na področju politike razvoja podeželja. Prednostne naloge so zasnovane v skladu s prednostnimi nalogami Skupnosti na področju politike razvoja podeželja. NSNRP je pripravljen za obdobje 2007-2013 in se bo, če posamezne prednostne naloge ne opredeljujejo drugače, izvajal na celotnem območju Republike Slovenije. Dokument je pripravljen v skladu z izhodišči, podanimi v 11. členu Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Nacionalne prednostne naloge in aktivnosti so izbrane na način in v obliki, ki omogoča ustvarjanje sinergij z drugimi javnofinančnimi inštrumenti na področju kmetijske politike, pa tudi na področju ekonomske in socialne kohezije ter prostora in okolja.

Investicija zasleduje cilje 3. osi, in sicer izboljšanje kakovosti življenja na podeželju z oživitvijo vaških jeder, obnovo in izgradnjo večnamenskih objektov, urejanjem tematskih poti, obnovo kulturne in naravne dediščine. Izpolnjeni cilji lahko služijo opravljanju raznih storitev in prispevajo k višji kakovosti življenja na podeželju. Spodbude so namenjene predvsem obnovi in izgradnji skupnih javnih objektov in prostorov z namenom izboljšati družbene, kulturne in druge aktivnosti v vasi. Poseben poudarek je dan tudi ohranitvi in obnovi kulturnih spomenikov značilnih za podeželje. Z namenom spodbujanja turizma se ohranjajo naravne vrednote, urejajo razne tematske poti in ostala potrebna infrastruktura. Spodbude prispevajo predvsem k zmanjšanju razlik med urbanim in ruralnim prostorom ter h kvalitetnejšemu življenju na podeželju.

3.5 Zakonodaja, ki ureja predmetno področje

Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02 z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami), ta zakon ureja pogoje za graditev vseh objektov, določa bistvene zahteve in njihovo izpolnjevanje glede lastnosti objektov, predpisuje način in pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so v zvezi z graditvijo objektov, ureja organizacijo in delovno področje dveh poklicnih zbornic, ureja inšpekcijsko nadzorstvo, določa sankcije za prekrške, ki so v zvezi z graditvijo objektov ter ureja druga vprašanja, povezana z graditvijo objektov ter določa, da graditev objekta po tem zakonu obsega projektiranje, gradnjo in vzdrževanje objekta.

Zakon o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 110/02 z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami), Ta zakon ureja prostorsko načrtovanje kot del urejanja prostora, tako da določa vrste prostorskih aktov, njihovo vsebino in medsebojna razmerja ter postopke za njihovo pripravo in sprejem.

Cilj prostorskega načrtovanja je omogočati skladen prostorski razvoj z obravnavo in usklajevanjem različnih potreb in interesov razvoja z javnimi koristmi na področjih varstva

okolja, ohranjanja narave in kulturne dediščine, varstva naravnih virov, obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Posege v prostor in prostorske ureditve je treba načrtovati tako, da se omogoča:

1. trajnostni razvoj v prostoru in učinkovita in gospodarna raba zemljišč,
2. kakovostne bivalne razmere,
3. prostorsko usklajeno in med seboj dopolnjujočo se razmestitev različnih dejavnosti v prostoru,
4. prenovo obstoječega, ki ima prednost pred graditvijo novega,
5. ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora,
6. sanacijo degradiranega prostora,
7. varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanje narave,
8. celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino,
9. zagotavljanje zdravja prebivalstva,
10. funkcionalno oviranim osebam neoviran dostop do objektov in njihova uporaba skladno z zakonom ter
11. obrambo države in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Prostorsko načrtovanje je v javnem interesu.

Zakon o javnih naročilih ZJN-2 (Uradni list RS, št. 128/06 z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami). Ta zakon določa obvezna ravnanja naročnikov in ponudnikov pri javnem naročanju blaga, storitev in gradenj.

4 OPIS VARIANTE »Z« INVESTICIJO, PREDSTAVLJENIH V PRIMERJAVI Z ALTERNATIVO »BREZ« INVESTICIJE IN/ALI MINIMALNO ALTERNATIVO

V skladu z uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. List RS, št. 60/2006 in 54/2010) mora dokument identifikacije investicijskega projekta vsebovati najmanj varianto »brez« in varianto »z« investicijo.

4.1 Varianta »brez« investicije

V Dokumentu identifikacije investicijskega projekta so prikazane variante »brez« investicije in »z« investicijo.

Varianta »brez« investicije predstavlja nezmožnost realizacije projekta Občine Majšperk. Brez investicije ostane stanje nespremenjeno, ko društva, kultura in turizem nimajo osnove za nadaljnji razvoj dejavnosti, saj občina nima v lasti nobenega drugega prostora, da bi lahko zagotovila izvajanje dejavnosti.

Z realizacijo investicijskega projekta bi Občina Majšperk sledila vsem direktivam, strategijam in programom, ki jih narekuje Slovenija in Evropska unija na področju gradnje infrastrukture.

Izgradnja večnamenske stavbe je namenjena povečanju kakovosti bivanja z razvojem društvenih dejavnosti kulture in turizma v kraju.


Pomembno je doseči ustrezno infrastrukturo, ki bo vplivala na izboljšano družbeno sliko in izboljšano okolje v širši regiji. Z investicijo skušamo zagotoviti ugodnejše bivalne pogoje in pogoje za kvalitetno preživljanje prostega časa ter s tem povečati prirast prebivalstva ter zaježiti izseljevanje iz vasi.

4.2 Varianta »z« investicijo

Pri iskanju možnih rešitev za zagotovitev ustreznih prostorov smo ugotovili, da je najbolj smotno pristopiti k celoviti rešitvi z zagotovitvijo novih prostorov in ureditvijo okolice in s tem izboljšanjem celotnega naselja.

Varianta »z« investicijo je edina rešitev za zagotovitev ustreznih pogojev delovanja društev v Narapljah. Prav tako je varianta »z« investicijo mnogo ugodnejša z ekonomskega vidika, saj pričakujemo manjše izseljevanje in večje priseljevanje v kraj zaradi ugodnejših življenjskih in bivalnih pogojev.

Investicija se bo izvedla na parcelni številki 99/4, k.o. Sitež. Parcela je razvidna iz spodnje slike:

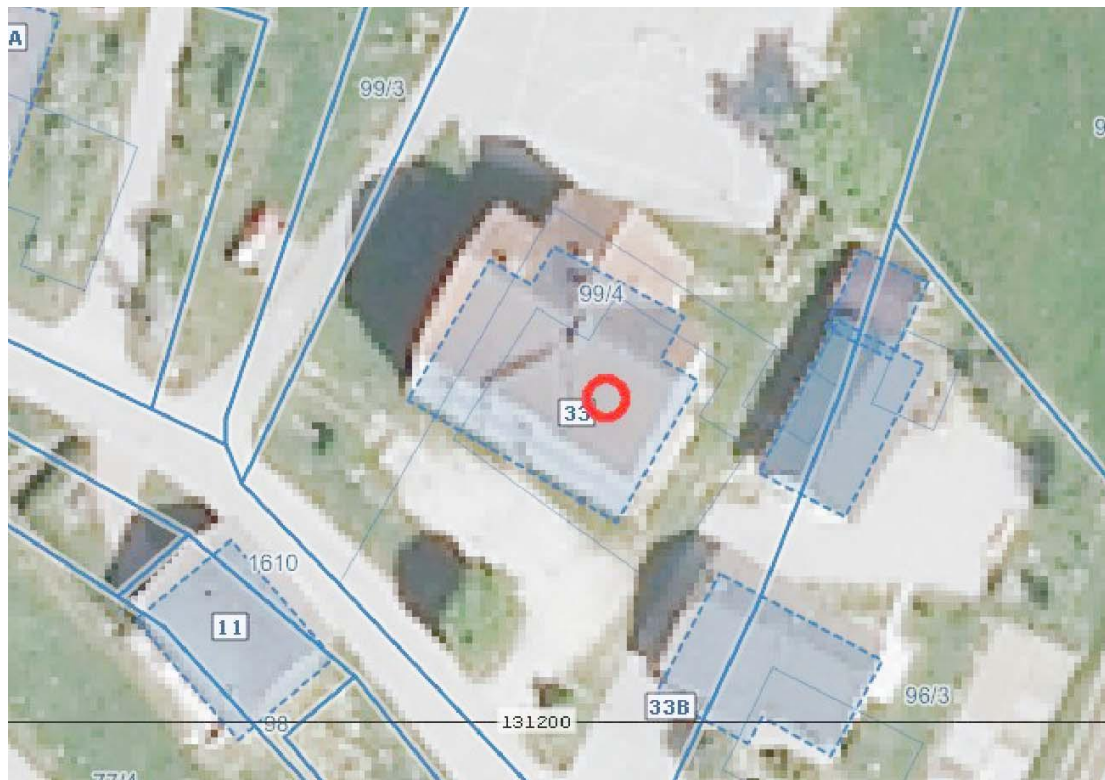

Slika 1: Prikaz območja iz idejne zasnove

5 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE

5.1 Opredelitev osnovnih tehnično-tehnoloških rešitev v okviru operacije

Namen investicije je zagotoviti možnost razvoja dejavnosti društev s področja kulture in turizma ter njihov nadaljnji razvoj. V fazi ureditve je potrebno porušiti dotrajan objekt, zaščititi klet in kletno ploščo za kasnejšo obnovo, zgraditi nov objekt v skupni velikosti 227,70 m² in ga opremiti za delovanje društev, asfaltirati parkirišče pred objektom in zasaditi okolico.

Podlaga za pripravo ocene vrednosti investicije je idejna zasnova št. 21028-14-K/GK, ki jo je izdelal TMD invest d.o.o., Prešernova 30, 2250 Ptuj junija 2014.

6 OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV

V nadaljevanju so navedene celotne investicijske vrednosti za izvedbo investicijskega projekta VEČNAMENSKI OBJEKT NARAPLJE.

Osnova za oceno vrednosti je idejna zasnova, izdelana junija 2014.

Celotna investicijska vrednost je ocenjena na 108.776,66 EUR brez DDV in **132.707,52 z DDV**.

6.1 Ocena celotnih investicijskih stroškov po stalnih cenah

Tabela 6/1: Celotna investicijska vrednost projekta po stalnih cenah (v EUR)

Zap. št.	VRSTA DELA	VREDNOST brez DDV	VREDNOST z DDV
1.	Idejna zasnova s projektom za rušitev stavbe	2.500,00	3.050,00
2.	Projektna dokumentacija PGD, PZI	6.300,00	7.686,00
3.	Rušitev osnovne šole in zaščita kletne plošče	8.466,66	10.329,32
4.	Gradnja novega objekta z opremo	81.000,00	98.820,00
5.	Parkirišče in dovozna pot	8.010,00	9.772,20
6.	Zasaditev okolice	1.500,00	1.830,00
7.	Gradbeni nadzor	1.000,00	1.220,00
SKUPAJ VREDNOST brez DDV		108.776,66	
DDV - 22%			23.930,86
SKUPAJ VREDNOST z DDV			132.707,52

Skupna vrednost investicije po stalnih cenah z DDV-jem je **132.707,52 EUR**.

6.1.1 Terminski plan glede vrste stroškov po stalnih cenah

Tabela 6/2: Celotna investicijska vrednost po stalnih cenah v EUR z upoštevanim davkom na dodano vrednost

INVESTICIJA	2014	2015	2016	2017
Idejna zasnova s projektom za rušitev stavbe	3.050,00	0,00	0,00	0,00

Projektna dokumentacija PGD, PZI	0,00	7.686,00	0,00	0,00
Rušitev osnovne šole in zaščita kletne plošče	0,00	10.329,32	0,00	0,00
Gradnja novega objekta z opremo	0,00	0,00	49.410,00	49.410,00
Parkirišče in dovozna pot	0,00	0,00	0,00	9.772,20
Zasaditev okolice	0,00	0,00	0,00	1.830,00
Gradbeni nadzor	0,00	0,00	610,00	610,00
Skupaj (celotna inv. vrednost) z DDV	3.050,00	18.015,32	50.020,00	61.622,20

6.2 Ocena celotnih investicijskih stroškov po tekočih cenah

Glede na to, da je predvidena dinamika investiranja daljša od enega leta, je skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06 in 54/2010) potrebno investicijsko vrednost prikazati tudi po tekočih cenah.

Pri preračunu investicijskih vrednosti po tekočih cenah smo upoštevali sledeče predpostavke:

- Za leto 2015 smo upoštevali inflacijsko stopnjo 0,6 %,
- Za leto 2016 smo upoštevali inflacijsko stopnjo 1,2 % in
- Za leto 2017 smo upoštevali inflacijsko stopnjo 1,2 %².

(Vir: jesenska napoved gospodarskih gibanj 2014-2016, UMAR)

Tabela 6/3: Vrednostna dinamika izvedbe projekta po tekočih cenah v EUR

Zap. št.	VRSTA DELA	VREDNOST brez DDV	VREDNOST z DDV
1.	Idejna zasnova s projektom za rušitev stavbe	2.500,00	3.050,00
2.	Projektna dokumentacija PGD, PZI	6.300,00	7.686,00
3.	Rušitev osnovne šole in zaščita kletne plošče	8.517,46	10.391,30
4.	Gradnja novega objekta z opremo	82.463,83	100.605,87

² Jesenska napoved UMAR še ne vsebuje inflacije za leto 2017, zato smo pri izračunu upoštevali enako stopnjo kot leto prej.

VEČNAMENSKI OBJEKT NARAPLJE

5.	Parkirišče in dovozna pot	8.203,39	10.008,14
6.	Zasaditev okolice	1.536,22	1.874,19
7.	Gradbeni nadzor	1.018,07	1.242,04
SKUPAJ VREDNOST brez DDV		110.538,97	
DDV - 22%			24.318,57
SKUPAJ VREDNOST z DDV			134.857,54

* - izdatki za izdelavo idejne zasnove s projektom za rušitev stavbe so nastali v letu 2014, zato niso preračunani na tekoče cene. Prav tako je projektna dokumentacija že naročena in je zato cena fiksna.

Skupna vrednost investicije po tekočih cenah znaša z DDV-jem je **134.857,54 EUR**.

6.2.1 Terminski plan glede vrste stroškov po tekočih cenah

Tabela 6/4: Celotna investicijska vrednost po tekočih cenah v EUR z upoštevanim davkom na dodano vrednost

INVESTICIJA	2014	2015	2016	2017
Idejna zasnova s projektom za rušitev stavbe	3.050,00	0,00	0,00	0,00
Projektna dokumentacija PGD, PZI	0,00	7.686,00	0,00	0,00
Rušitev osnovne šole in zaščita kletne plošče	0,00	10.391,30	0,00	0,00
Gradnja novega objekta z opremo	0,00	0,00	50.302,93	50.302,94
Parkirišče in dovozna pot	0,00	0,00	0,00	10.008,14
Zasaditev okolice	0,00	0,00	0,00	1.874,19
Gradbeni nadzor	0,00	0,00	621,02	621,02
Skupaj (celotna inv. vrednost) z DDV	3.050,00	18.077,30	50.923,95	62.806,29

7 TEMELJNE PRVINE, KI DOLOČAJO INVESTICIJO

7.1 Predhodna idejna rešitev ali študija

Za obseg potrebne vsebine dokumenta identifikacije investicijskega projekta smo upoštevali Uredbo o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/2006 in 54/2010).


Za strokovno vsebino smo uporabili izhodiščne podatke – idejna zasnova št. 21028-14-K/GK, ki jo je izdelal TMD invest d.o.o., Prešernova 30, 2250 Ptuj junija 2014.

Vsa navedena dokumentacija se smiselno upošteva pri izdelavi investicijske dokumentacije.


7.2 Opis in grafični prikaz lokacije

Predmetna investicija se bo izvajala na področju Občine Majšperk, v naselju Naraplje. Območje posega na parcelne številke 99/4, k.o. Sitež.


Slika 7/1: Prikaz parcele na območju projekta

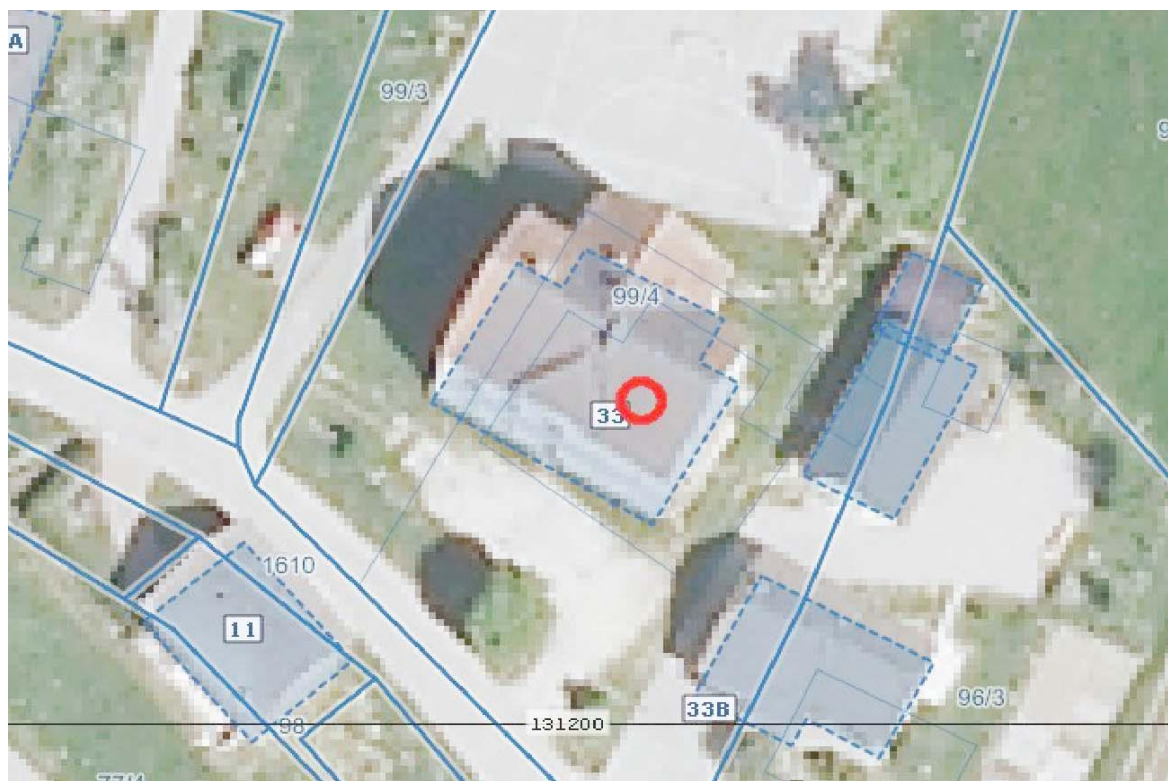


Slika 7/2: Ureditvena situacija

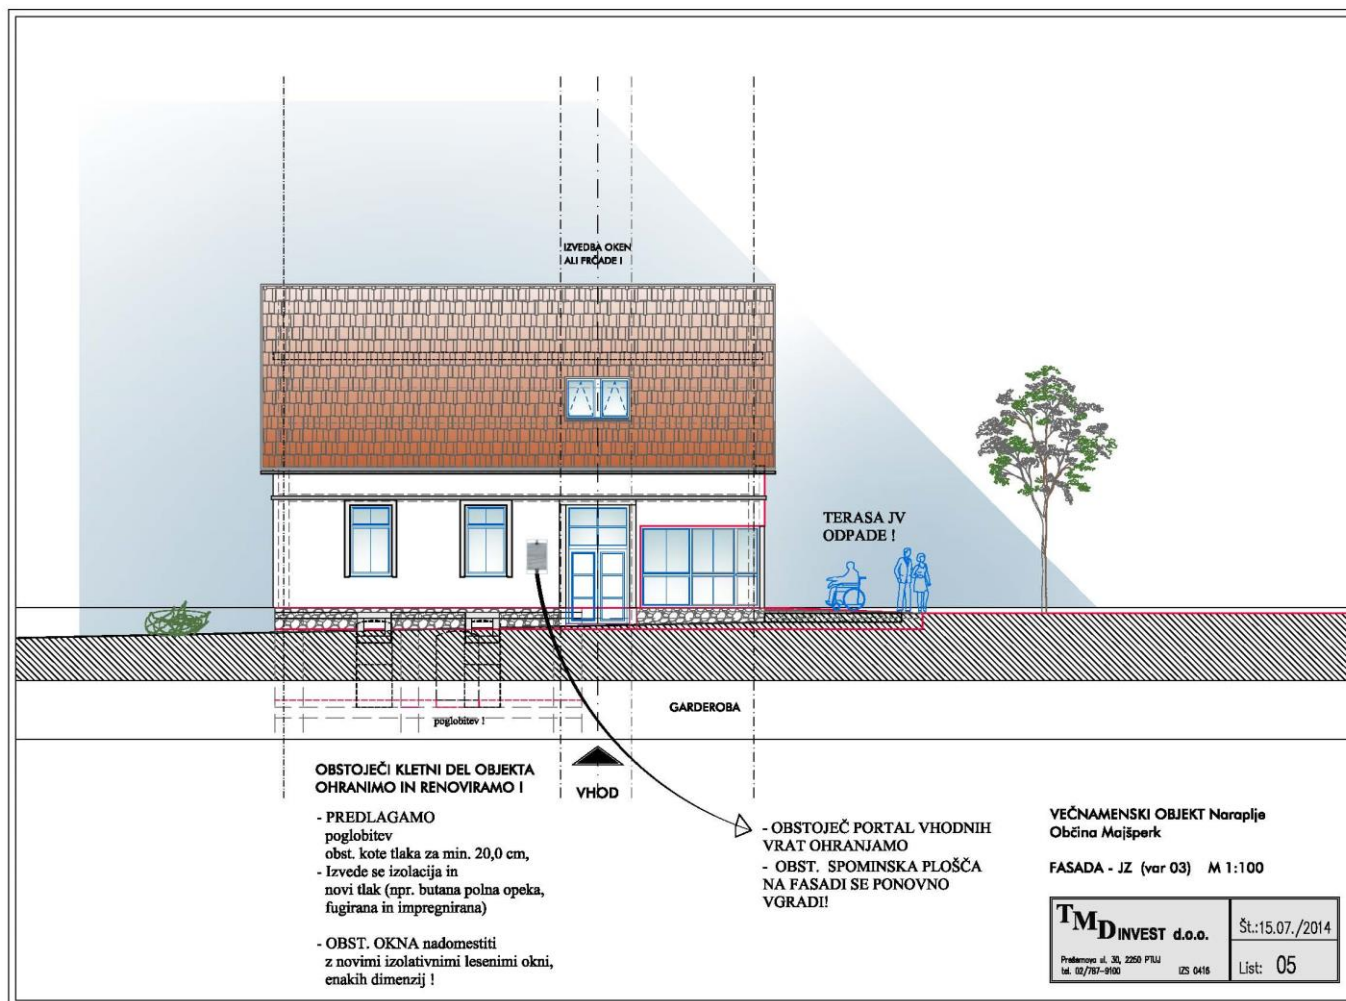


Slika 7/3: Ureditvena situacija 2

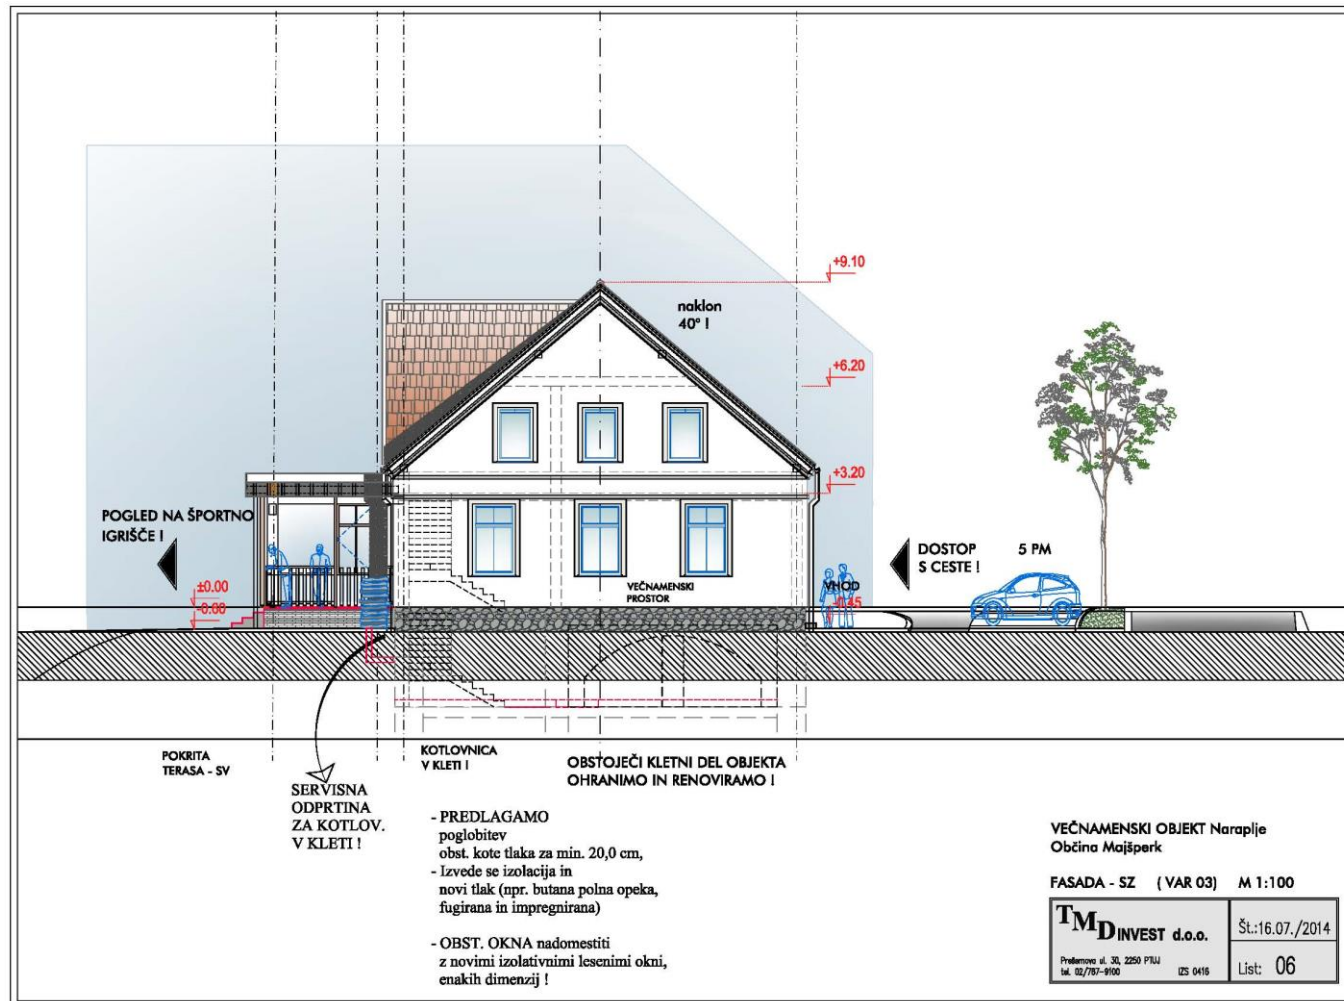

Slika 7/4: Ureditvena situacija 3

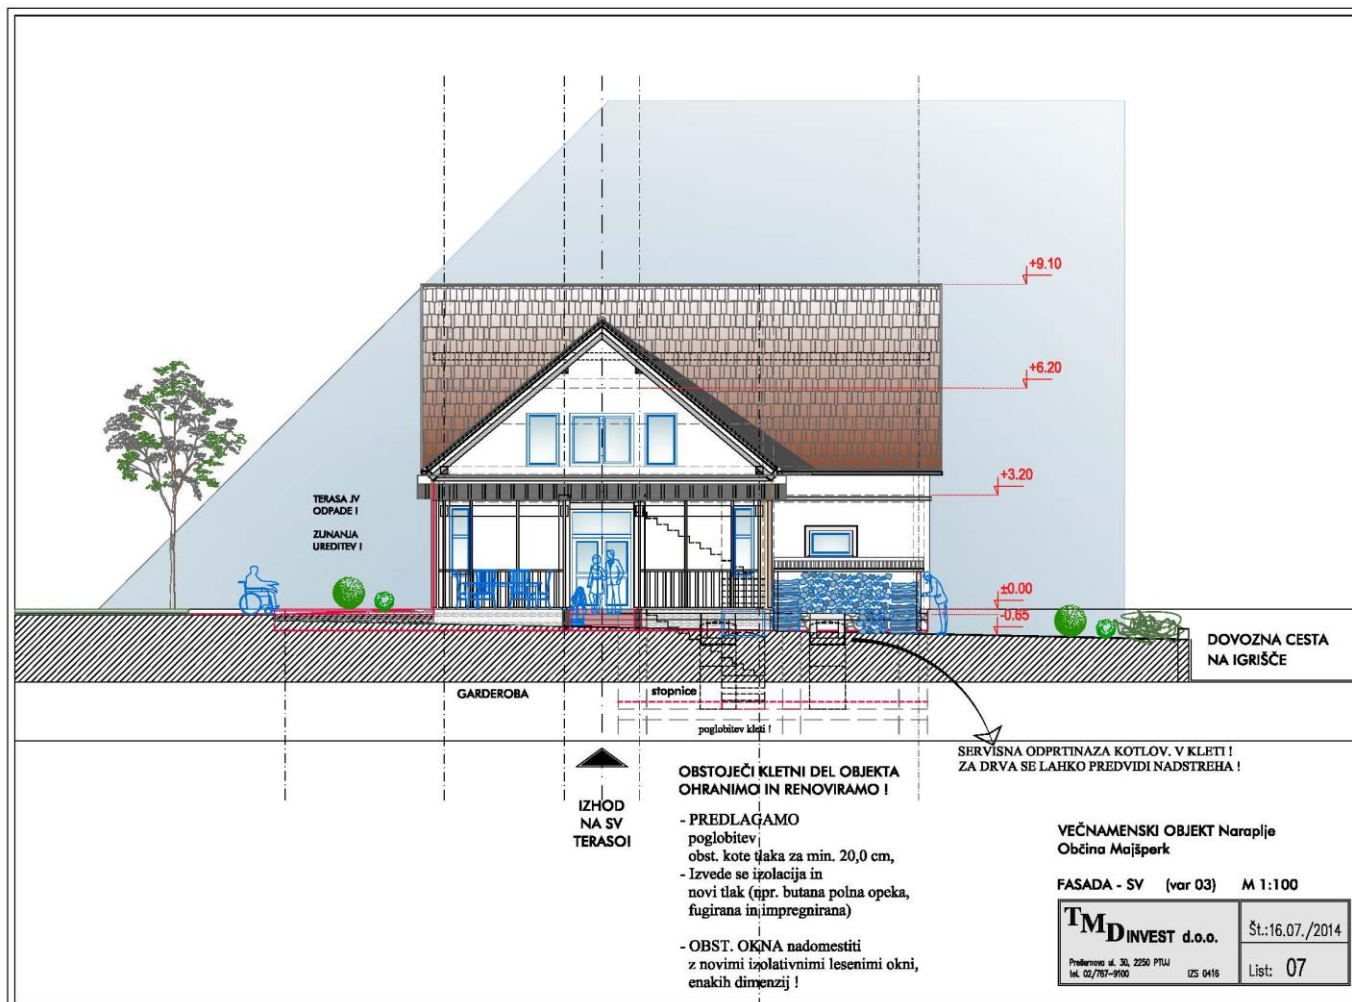

Slika 7/5: Ureditvena situacija 4

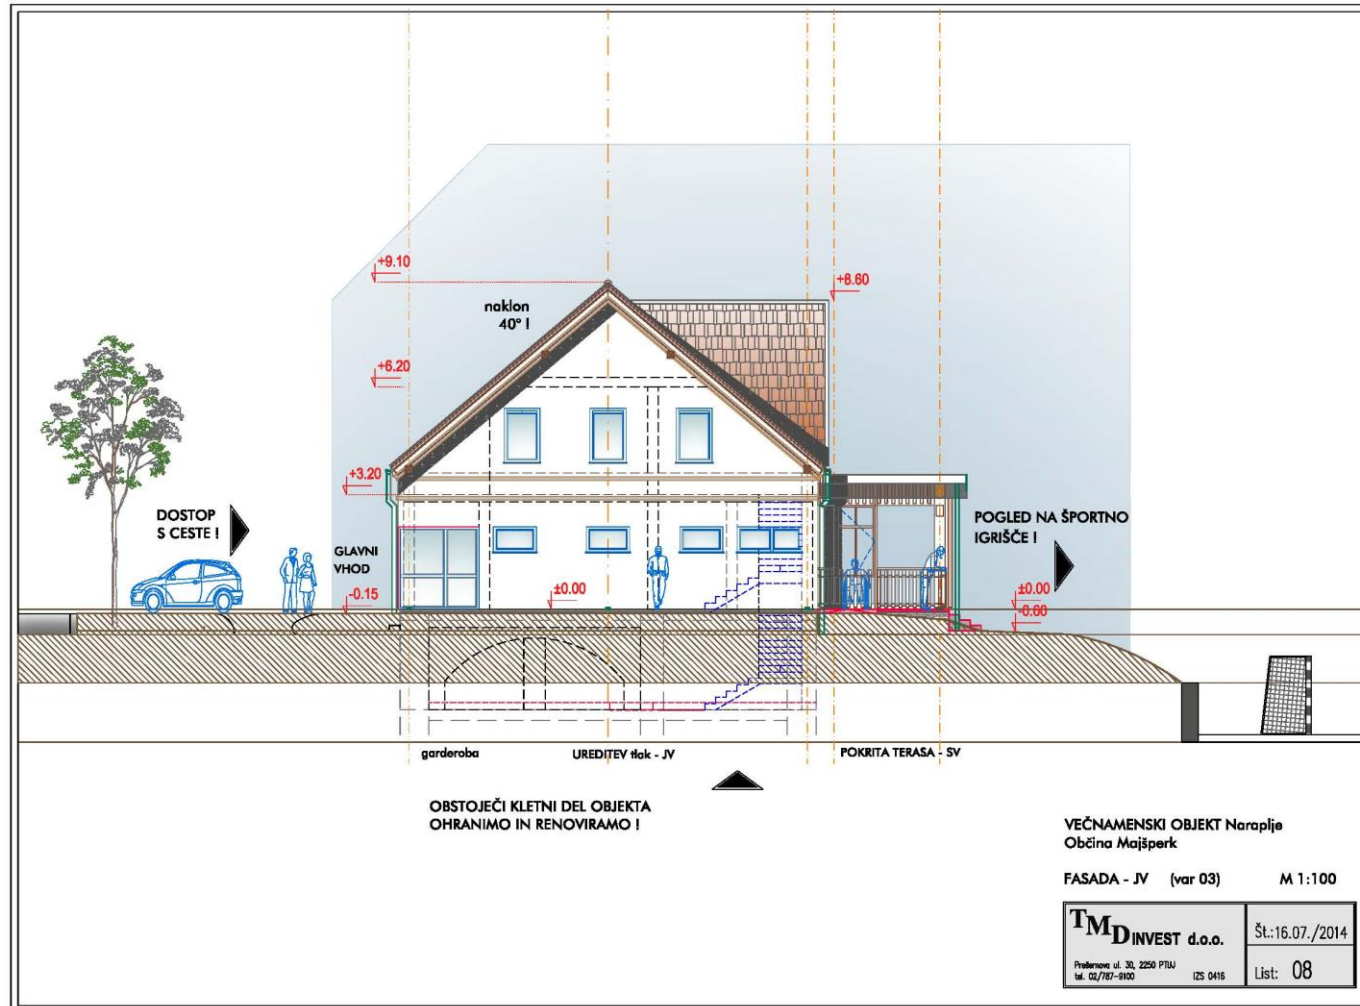

7.3 Obseg in specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe

Tabela 7/1: Obseg in specifikacija investicijske naložbe po tekočih cenah

Leto	Vrsta specifikacije	Vrednost investicije v EUR, brez DDV	Vrednost investicije v EUR, z DDV
2014	Idejna zasnova s projektom za rušitev stavbe	2.500,00	3.050,00
	Skupaj:	2.500,00	3.050,00
2015	Projektna dokumentacija PGD, PZI	6.300,00	7.686,00
	Rušitev OŠ in zaščita kletne plošče	8.517,46	10.391,30
	Skupaj:	14.817,46	18.077,30
2016	Gradnja novega objekta z opremo	41.231,91	50.302,93
	Gradbeni nadzor	509,03	621,02
	Skupaj:	41.740,94	50.923,95
2017	Gradnja novega objekta z opremo	41.231,92	50.302,94
	Parkirišče in dovozna pot	8.203,39	10.008,14
	Zasaditev okolice	1.536,22	1.874,19
	Gradbeni nadzor	509,04	621,02
	Skupaj:	51.480,57	62.806,29
Skupaj		110.538,97	134.857,54

Obseg naložbe je:

- Večnamenski objekt Naraplje.

Natančnejša vsebinska in vrednostna predstavitev posamezne investicije je predstavljena v poglavju 4 in 5.

Pri terminskem planu izvedbe investicije so bili upoštevani naslednji kriteriji in sicer:

- **Zagotovljena sredstva v proračunu Občine Majšperk 2015 in**
- **Zagotovljena sredstva v načrtu razvojnih programov 2015 – 2018.**

Tabela 7/2: Terminski plan

AKTIVNOST	ZAČETEK	KONEC
Idejna zasnova s projektom za rušitev stavbe	maj 2014	julij 2014
Izdelava investicijske dokumentacije - DIIP	januar 2015	januar 2015
Potrditev investicijske dokumentacije - DIIP	januar 2015	januar 2015
Projektna dokumentacija PGD, PZI	januar 2015	maj 2015
Rušitev OŠ in zaščita kletne plošče	maj 2015	oktober 2015
Gradnja novega objekta z opremo	marec 2016	september 2017
Parkirišče in dovozna pot	maj 2017	september 2017
Zasaditev okolice	maj 2017	september 2017
Gradbeni nadzor	marec 2016	september 2017

7.4 Varstvo okolja

Predmetna investicija je namenjena tudi varovanju okolja in preprečevanju njegovega onesnaževanja. Načrtovana investicija ne bo imela negativnega vpliva na okolje. Neposredne koristi ureditve območja se bodo odrazile v manjšem obremenjevanju okolja z odpadanjem delov iz dotrajane stavbe.

7.4.1 Učinkovita izraba naravnih virov

Pri gradnji bodo uporabljeni preizkušeni, okolju neškodljivi materiali. Zemeljska dela bodo potekala po trasi, kjer ni zaznanih varovanih vegetacij.

7.4.2 Okoljska učinkovitost

Izvajanje investicije ne bo ustvarjalo industrijskih odpadnih vod. Pri gradnji bodo uporabljeni naravni in okolju prijazni materiali, kolikor in kjer je to mogoče.

Investicija je zasnovana in bo izvedena v skladu z veljavnimi okoljevarstvenimi standardi in bo upoštevala vse zahteve, ki izhajajo iz pridobljenega gradbenega dovoljenja, v času obratovanja pa bo vpliv objekta na okolje pod dopustno stopnjo obremenjevanja.

7.4.3 Trajnostna dostopnost

Trajnostna dostopnost se z ureditvijo degradiranega območja kaže predvsem trajnostni zagotovitvi varovanja okolja, večji privlačnosti naselja, izboljššanemu bivanjskemu okolju in možnosti za druženje, razvoj kulture in turizma. Vse to bo ugodno vplivalo na rast gospodarstva v regiji.

7.4.4 Zmanjšanje vplivov na okolje

- **Tla**

Vpliv na tla bo ugoden. Zaradi izvajanja projekta ne bo prišlo do spremembe rabe in dodatnega obremenjevanja tal. Onemogočeno bo odpadanje materialov iz dotrajane stavbe.

- **Voda**

Vpliva na površinske vode ne bo. Med gradnjo bodo izvedeni vsi ukrepi, ki bodo zmanjševali emisije.

- **Emisije v zrak**

Vpliva na emisije v zrak ne pričakujemo. Med gradnjo bodo izvedeni vsi ukrepi, ki bodo zmanjševali emisije v zrak.

7.4.5 Hrup

Obremenitev okolja s hrupom je predpisana z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur.l. RS, št. 105/2005).

V času urejanja parka bo hrup povečan, vendar ne bo presegal dopustnih ravni hrupa na poseljenih območjih in naravovarstveno pomembnih območjih. Tudi kumulativni vpliv hrupa ob izvedbi plana je sprejemljiv.

7.4.6 Ukrepi za odpravo negativnih vplivov na okolje

Dodatni omilitveni ukrepi za odpravo negativnih vplivov na okolje niso potrebni, ker predmetna investicija ne bo presegala dovoljenih negativnih vplivov na okolje.

7.5 Ocena stroškov za odpravo negativnih vplivov

Ocena vpliva na okolje za projekt »VEČNAMENSKI OBJEKT NARAPLJE« ni bila izdelana, saj negativni vplivi ne bodo presegali mejnih vrednosti.

7.6 Kadrovska organizacijska shema s prostorsko opredelitvijo

Investicijo bo izvajala Občina Majšperk. Za izvedbo investicijskega projekta bo odgovorna županja Občine Majšperk, dr. Darinka FAKIN.

V nadaljevanju prikazujemo kadrovska organizacijska shema za omenjen projekt. Občina Majšperk je določila glavnega koordinatorskega projekta, to je Matic ŠINKOVEC, ki skrbi za koordinacijo projekta od investicijske, in projektne dokumentacije do izgradnje in predaje namenu.

Slika 7/6:Kadrovska-organizacijska shema

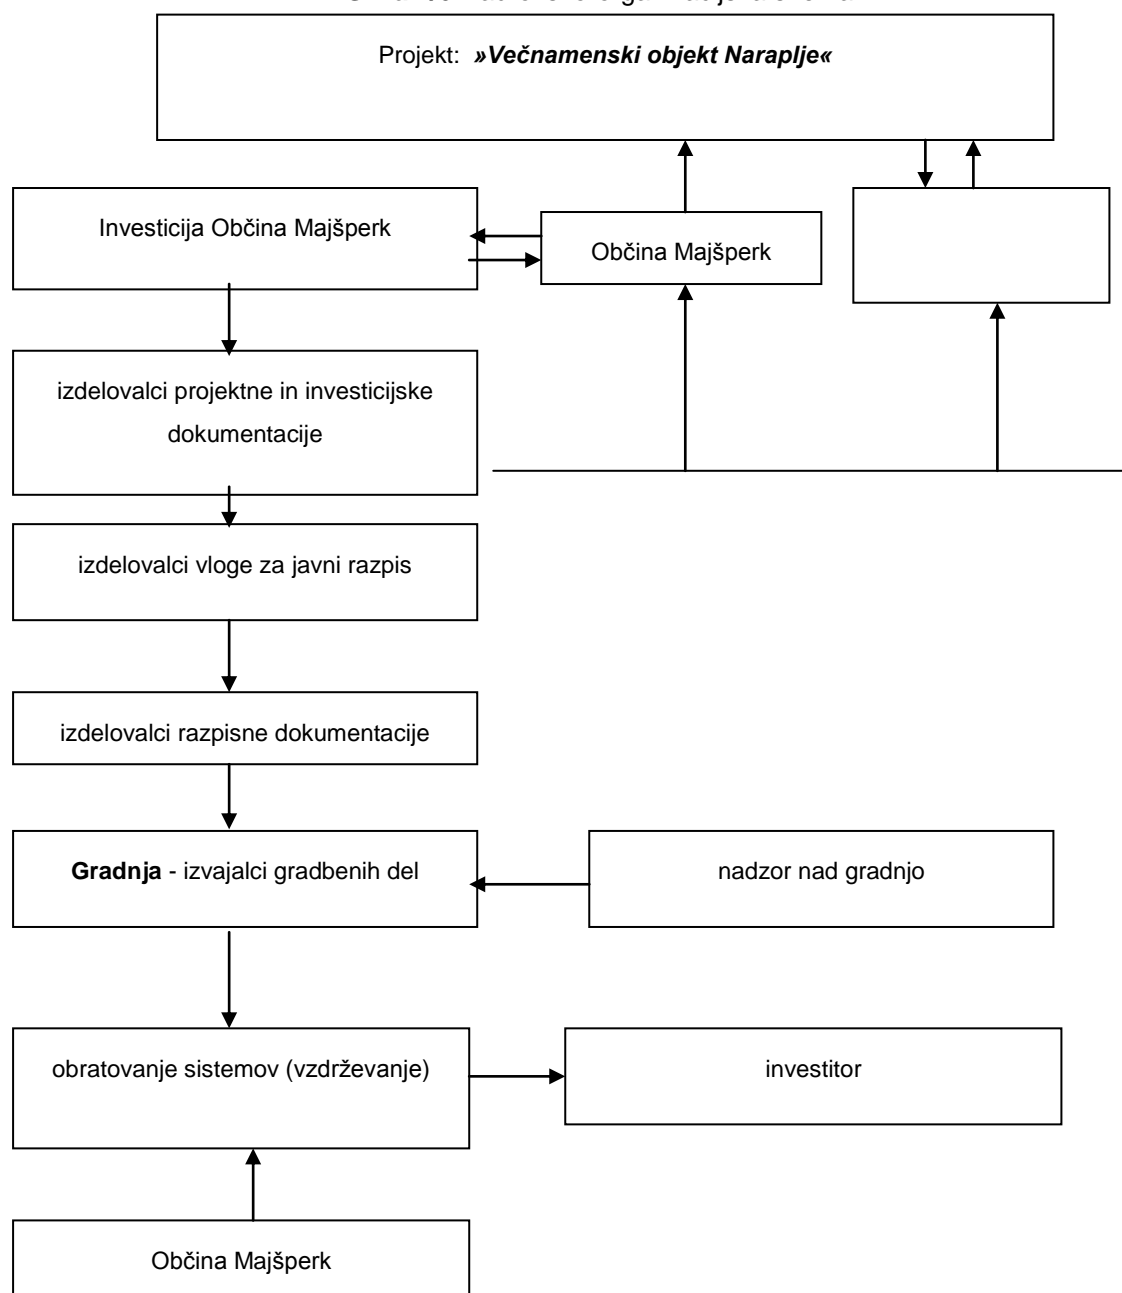


Tabela 7/3: Projektna skupina

Naziv dela	Izvajalec
Vodja investicije:	dr. Darinka FAKIN, Občina Majšperk
Koordinator projekta:	Matic ŠINKOVEC, Občina Majšperk
Strokovna pomoč:	TMD invest d.o.o.
Strokovna pomoč:	Nadzor nad gradnjo

Zaposlitev nove osebe za izvajanje projekta in upravljanje večnamenskega objekta ne bo potrebna, saj ima občina za to usposobljen kader.

Za pridobitev gradbene in ostale potrebne dokumentacije bo skrbel TMD invest d.o.o., ki je bil izbran za izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja.

Razpisno dokumentacijo in postopke javnega naročanja izvajalcev bo izvedla občinska uprava Občine Majšperk.

Gradbeni nadzor bo izvajal usposobljeni nadzornik. Izvajalec bo izbran na osnovi zbiranja ponudb. Enako velja za koordinatorja varnosti na gradbišču.

Tabela 7/4: Preglednica članov projektne skupine

ČLANI PROJEKTNE SKUPINE ZA VODENJE PROJEKTA				
Ime in priimek	Izobrazba	Leta del. izkušenj	Strokovno področje, ki ga pokriva	Zadolžitev v okviru predloženega projekta
Matic ŠINKOVEC	Mag. jav. upr.	11	Vodenje operacije, koordiniranje investicij.	Vodja projekta in tehnična – strokovna podpora
Tatjana VARŽIČ KOREZ	Univ. dipl. pravnik	15	Zakonodaja, pravo.	Tehnična in strokovna podpora

Matic ŠINKOVEC:

Delovno mesto: Višji svetovalec za vodenje projektov

Izobrazba: mag. jav. upr.

Izbrani referenčni projekti:

1. Naziv projekta	Ministrstvo za šolstvo in šport – sofinanciranje izgradnje telovadnice pri OŠ Makole
Obdobje	2008-2009
Položaj	Projekt je realiziran. Projekt je bil delno s sredstvi MŠŠ.
2. Naziv projekta	Fundacija za šport – sofinanciranje športne opreme
Obdobje	2008-2009
Položaj	Projekt je realiziran. Projekt je bil delno financiran s strani Fundacije za šport.
3. Naziv projekta	Oskrba s pitno vodo na Območju Haloz
Obdobje	2009 - 2010
Položaj	Projekt je realiziran. Projekt je bil delno financiran s sredstvi EU in Ministrstva za okolje in prostor.
4. Naziv projekta	Obnova odseka lokalne ceste LC 240130 Doklece – Marinja vas in priključne javne poti JP Sitež - Vinarje
Obdobje	2009 - 2010
Položaj	Projekt je realiziran. Projekt je bil delno financiran s sredstvi EU.
5. Naziv projekta	Modernizacija LC Slape – Ptujška Gora
Obdobje	2010 - 2011
Položaj	Projekt je realiziran. Projekt delno financira EU.
6. Naziv projekta	LC Žetale – Vabča vas
Obdobje	2010 - 2011
Položaj	Projekt je realiziran. Projekt delno financira EU.
7. Naziv projekta	Komasacije Majšperk

Obdobje	2011 - 2013
Položaj	Projekt je realiziran. Projekt delno financira EU.
8. Naziv projekta	Kulturno poslovni center Majšperk
Obdobje	2010 - 2012
Položaj	Projekt je realiziran. Projekt delno financira EU.
9. Naziv projekta	Obnova starotrške hiše na Ptujski Gori
Obdobje	2012
Položaj	Projekt je realiziran. Projekt delno financira EU.
10. Naziv projekta	Obnova OŠ Ptujška Gora
Obdobje	2012
Položaj	Projekt je realiziran. Projekt delno financira EU.
9. Naziv projekta	Obnova LC Poluce – Bolfenk – Kosovo sedlo in JP Sitež - Jelovice
Obdobje	2013 - 2014
Položaj	Projekt je realiziran. Projekt delno financira EU.
10. Naziv projekta	Razširitev vrtca Majšperk
Obdobje	2013 - 2014
Položaj	Projekt je realiziran. Projekt delno financira EU.

Tatjana VARŽIČ KOREZ:

Delovno mesto: Višji svetovalec za premoženjsko pravne zadeve

Izobrazba: univ. dipl. prav.

Izbrani referenčni projekti:

1. Naziv projekta	Vodovodni sistem Majšperk
Obdobje	2005-2006

VEČNAMENSKI OBJEKT NARAPLJE

Položaj	Projekt je realiziran. Projekt je bil delno financiran s sredstvi EU.
2. Naziv projekta	Modernizacija kolesarske in pohodniške poti Stoperce – Sučje na odseku Stoperce - Benetek
Obdobje	2004
Položaj	Projekt je realiziran. Projekt je bil delno financiran s sredstvi EU.
3. Naziv projekta	Čistilna naprava Majšperk
Obdobje	2005 - 2006
Položaj	Projekt je realiziran. Projekt je bil delno financiran s sredstvi EU.
4. Naziv projekta	Kanalizacija za odpadne vode v naselju Majšperk
Obdobje	2005 - 2006
Položaj	Projekt je realiziran. Projekt je bil delno financiran s sredstvi EU.
5. Naziv projekta	Sekundarna kanalizacija Lešje
Obdobje	2008 - 2009
Položaj	Projekt je realiziran. Projekt je bil delno financiran s sredstvi EU.
6. Naziv projekta	Turistična infrastruktura Ptujске gore
Obdobje	2007 - 2008
Položaj	Projekt je realiziran. Projekt je bil delno financiran s sredstvi EU.
7. Naziv projekta	Gradnja osnovne šole Majšperk
Obdobje	2004 - 2005
Položaj	Projekt je realiziran. Projekt je bil delno financiran s sredstvi Ministrstva za šolstvo in šport.
8. Naziv projekta	Oskrba s pitno vodo na Območju Haloz
Obdobje	2009 - 2010
Položaj	Projekt je realiziran.

	Projekt je bil delno financiran s sredstvi EU in Ministrstva za okolje in prostor.
9. Naziv projekta	Obnova odseka lokalne ceste LC 240130 Doklece – Marinja vas in priključne javne poti JP Sitež - Vinarje
Obdobje	2009 - 2010
Položaj	Projekt je realiziran. Projekt je bil delno financiran s sredstvi EU.

7.1 Predvideni viri financiranja po tekočih cenah

Tabela 7/5: Viri financiranja v EUR

Leto	Vrednost	2014	2015	2016	2017	Delež (v % od upravičenih stroškov)
LASTNA SREDSTVA - občinski proračun Občine Majšperk	134.857,54	3.050,00	18.077,30	50.923,95	62.806,29	100
SKUPAJ	134.857,54	3.050,00	18.077,30	50.923,95	62.806,29	100

Občina Majšperk bo za investicijo zagotovila **134.857,54 EUR**.

7.2 Pričakovana stopnja izrabe zmogljivosti oziroma ekonomska upravičenost projekta

Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na **družbenem področju**:

- Povečanje kakovosti življenja prebivalcev na predmetnem področju kar posredno vpliva na večjo rast prebivalstva z vidika poselitve in možnost razvoja ter zaposlovanja

Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na **razvojno gospodarskem področju**:

- Z implementacijo projekta se pričakuje celovit razvoj podeželja, saj bo z ureditvijo navedene infrastrukture možen izkoristek vseh naravnih danosti.
- Povečana privlačnost turistično atraktivne lokacije in s tem povečanje gospodarstva.

Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na **okoljevarstvenem področju**:

- Zmanjšanje onesnaževanja okolja z odpadlimi deli dotrajane stavbe.

8 ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI TER DOLOČITEV NEPOVRATNE POMOČI

8.1 Finančna analiza

Cilj finančne analize investicije je ocena finančne donosnosti neposredne naložbe brez stranskih vplivov in učinkov.

V finančni analizi bomo upoštevali naslednje podatke:

- referenčno časovno obdobje investicije je 20 let,
- finančna diskontna stopnja je 7%³,
- prvi mesec in leto rednega obratovanja investicije je 1. oktober 2017,
- ocenjeni strošek investicije v višini 132.707,52 z DDV (stalne cene),
- vzdrževalni in obratovalni stroški: Upoštevali smo minimalne vzdrževalne stroške, ki izhajajo predvsem iz naslova manjših popravil opreme, vzdrževanje okolice in parkirišča v skupni višini 650,00 EUR letno za prvih 5 let investicije in 1.250,00 EUR za naslednja leta.
- prihodki: predmetna investicija v ekonomski dobi ne ustvarja prihodkov.
- dejanska ekonomska življenjska doba investicije presega zadevno referenčno časovno obdobje, zato prikazujemo tudi preostalo vrednost (ocenjena tržna vrednost po zaključku referenčnega obdobja – 20 % vrednosti investicije),
- Zneski so preračunani s pomočjo Microsoft excel tabele in zaokroženi na dve decimalni mesti.

8.1.1 Projekcija operativnih stroškov

Tabela 8/1: Projekcija operativnih stroškov

2018	650,00	650,00
2019	650,00	650,00
2020	650,00	650,00
2021	650,00	650,00
2022	650,00	650,00
2023	1.250,00	1.250,00
2024	1.250,00	1.250,00
2025	1.250,00	1.250,00
2026	1.250,00	1.250,00
2027	1.250,00	1.250,00
2028	1.250,00	1.250,00
2029	1.250,00	1.250,00

³ V skladu z 8. členom uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006 in 54/2010)

VEČNAMENSKI OBJEKT NARAPLJE

2030	1.250,00	1.250,00
2031	1.250,00	1.250,00
2032	1.250,00	1.250,00
2033	1.250,00	1.250,00
Skupaj	17.000,00	17.000,00

Tabela 8/2: Preglednica stroškov in prihodkov – finančna analiza

Leto	Referenčna leta	Stroški investicije	Operativni stroški	Prihodki (€)	Ostane vrednosti (€)	NETO denarni tok (€)	Diskontirano - 7% (€)		
							Investicijski stroški	Operativni stroški	NETO denarni tok
							A	C-B	(C+D-B)-A
2014	0	3.050,00	0,00	0,00	0,00	-3.050,00	3.050,00	0,00	-3.050,00
2015	1	18.015,32	0,00	0,00	0,00	-18.015,32	16.836,75	0,00	-16.836,75
2016	2	50.020,00	0,00	0,00	0,00	-50.020,00	43.689,41	0,00	-43.689,41
2017	3	61.622,20	0,00	0,00	0,00	-61.622,20	50.302,07	0,00	-50.302,07
2018	4	0,00	650,00	0,00	0,00	-650,00	0,00	495,88	-495,88
2019	5	0,00	650,00	0,00	0,00	-650,00	0,00	463,44	-463,44
2020	6	0,00	650,00	0,00	0,00	-650,00	0,00	433,12	-433,12
2021	7	0,00	650,00	0,00	0,00	-650,00	0,00	404,79	-404,79
2022	8	0,00	650,00	0,00	0,00	-650,00	0,00	378,31	-378,31
2023	9	0,00	1.250,00	0,00	0,00	-1.250,00	0,00	679,92	-679,92
2024	10	0,00	1.250,00	0,00	0,00	-1.250,00	0,00	635,44	-635,44
2025	11	0,00	1.250,00	0,00	0,00	-1.250,00	0,00	593,87	-593,87
2026	12	0,00	1.250,00	0,00	0,00	-1.250,00	0,00	555,01	-555,01
2027	13	0,00	1.250,00	0,00	0,00	-1.250,00	0,00	518,71	-518,71
2028	14	0,00	1.250,00	0,00	0,00	-1.250,00	0,00	484,77	-484,77
2029	15	0,00	1.250,00	0,00	0,00	-1.250,00	0,00	453,06	-453,06
2030	16	0,00	1.250,00	0,00	0,00	-1.250,00	0,00	423,42	-423,42
2031	17	0,00	1.250,00	0,00	0,00	-1.250,00	0,00	395,72	-395,72
2032	18	0,00	1.250,00	0,00	0,00	-1.250,00	0,00	369,83	-369,83
2033	19	0,00	1.250,00	0,00	26.541,50	25.291,50	0,00	345,64	6.993,31
Skupaj		132.707,52	17.000,00	0,00		-123.166,02	113.878,22	7.630,91	-114.170,19

Opomba:

- Prvi mesec in leto rednega obratovanja investicije je 1. oktober 2017, zato smo stroške računali od leta 2018 naprej.

Ugotovitev:

- Denarni tok v finančni analizi je negativen, kar pomeni, da investicija ne ustvarja presežka prihodkov nad stroški, zato se v finančnem smislu nikoli ne povrne.

8.1.2 Neto sedanja vrednost in interna stopnja donosa pri finančni analizi

Aproksimativni izračun neto sedanje vrednosti na podlagi podatkov iz zgornje preglednice in še z nekaterimi vhodnimi podatki je sledeč:

- vrednost investicije (stalna cena z DDV) = 132.707,52 EUR,
- ekonomska doba investicije $i = 20$ let,
- diskontna stopnja $p = 7\%$.

$$FNSV = \sum_{i=1}^n \frac{I_i}{(1+p)^i} \quad FNSV = -114.170,19$$

Kot pričakovano je neto finančna sedanja vrednost investicije negativna in znaša -114.170,19 EUR, finančna stopnja donosnosti pa je prav tako negativna.

Finančna interna stopnja donosnosti

$$FIRR = \text{negativna}$$

Relativna neto sedanja vrednost

$$RNSV = -1,002564$$

Obrazložitev:

- Neto sedanja vrednost ima oznako FNSV,
- V osnovnem izračunu je FNSV negativna in znaša -114.170,19 EUR,
- Eno od najpogosteje uporabljenih meril za presojanje smiselnosti investicijskega projekta je njegova neto sedanja vrednost ali čista sedanja vrednost. Višina neto sedanje vrednosti je neposredno odvisna od uporabljene obrestne mere kot cene kapitala oziroma od uporabljenega pripadajočega diskontnega faktorja $1+i$, s katerim reduciramo bodoče finančne tokove na začetni trenutek. V našem konkretnem zgledu smo vzeli obrestno mero 7 % letno. (Diskontna stopnja je letna odstotna mera, po kateri se sedanja vrednost denarne enote v naslednjih letih zmanjšuje s časom),
- Interna stopnja donosa ima oznako FIRR,
- Upoštevajoč investicijsko vrednost, prihodke in stroške poslovanja smo za izračun FIRR v nadaljevanju uporabili ekonomsko dobo trajanja projekta 20 let,
- Pri uporabljeni diskontni stopnji, ki je po stalnih cenah 7% iščemo v nadaljevanju projekta pozitivno neto sedanjo vrednost in interno stopnjo donosnosti višjo od uporabljene individualne diskontne stopnje 7%, s čimer bo investicija v tem primeru upravičena in ekonomsko smiselna.

8.2 Ekonomska analiza in denarni tok

8.2.1 Projekcija prihodkov – javno dobro

Izhodišča za izračun:

- referenčno časovno obdobje je 20 let,
- denarni tokovi iz finančne analize so izhodišče v ekonomski analizi,
- davčni popravki, pri čemer uporabimo:
 - konverzijski faktor za investicijske izdatke v višini **0,7167** (očiščeno davkov in prispevkov). Ocenjujemo, da struktura investicijskih izdatkov vsebuje 65% materiala in 35% delovne sile. V stroških delovne sile je 40% davkov in prispevkov. Delež davkov in prispevkov v celoti znaša $0,35 \cdot 0,4 \cdot 0,833$, kar znaša 0,1166. Stroški materiala vsebujejo 20% DDV ($100/1,2=0,833$). Konverzijski faktor za naložbene izdatke je tako $(0,833-0,1166)=0,7167$
 - konverzijski faktor za operativne stroške znaša **0,833** (DDV).
- mesec in leto začetka obratovanja investicije je oktober 2017,
- ostanek vrednosti investicije znaša 20% vrednosti investicije,
- izračuni in tabele so pripravljene v programu Microsoft Excel, zneski pa zaokroženi na dve decimalni mesti.

Tabela 8/3: Projekcija prihodkov – javno dobro

Leto	Prihodki – javno dobro		
	Izboljšano zdr. stanje in manjši strošek socialnega varstva	Učinek investicije v regiji	Skupaj
2014	0,00	1.748,75	1.748,75
2015	0,00	10.329,26	10.329,26
2016	0,00	28.679,47	28.679,47
2017	0,00	35.331,70	35.331,70
2018	2.300,00	0,00	2.300,00
2019	2.300,00	0,00	2.300,00
2020	2.300,00	0,00	2.300,00
2021	2.300,00	0,00	2.300,00
2022	2.300,00	0,00	2.300,00
2023	2.300,00	0,00	2.300,00
2024	2.300,00	0,00	2.300,00
2025	2.300,00	0,00	2.300,00

VEČNAMENSKI OBJEKT NARAPLJE

2026	2.300,00	0,00	2.300,00
2027	2.300,00	0,00	2.300,00
2028	2.300,00	0,00	2.300,00
2029	2.300,00	0,00	2.300,00
2030	2.300,00	0,00	2.300,00
2031	2.300,00	0,00	2.300,00
2032	2.300,00	0,00	2.300,00
2033	2.300,00	0,00	2.300,00
Skupaj	36.800,00	76.089,18	112.889,18

Javno dobro – Izboljšano zdravstveno stanje zaradi zmanjšanja obremenjevanja okolja

Izboljšanje kvalitete življenja zaradi medgeneracijskega druženja in vključevanja v družbo ima velike pozitivne učinke na družbo. S prostori za dejavnosti društev, kulture, turizma in kvalitetno preživljanje prostega časa pričakujemo zmanjšane potrebe po institucionalni oskrbi starejših in pozitivne učinke na zdravje ljudi ter posledično zmanjšanje stroškov zdravstvenega varstva. Letno smo te stroške ovrednotili z 2.300,00 EUR.

Javno dobro – Učinek investicije v regiji

Pričakujemo, da bodo vsaj 80% vseh del opravili delavci v regiji.

8.2.2 Preglednica investicije, prihodkov in stroškov – ekonomska analiza

Tabela 8/6: Preglednica stroškov in prihodkov investicije – ekonomska analiza

Leto	Referenčna leta	Stroški investicije v stalnih cenah (€)	Operativni stroški vzdrževanja (€)	Prihodki -javna korist (€)	Ostane vrednosti (€)	Neto denarni tok (€)	Diskontirani investicijski stroški (€)	Diskontirani prihodki (€)	Diskontirani NETO denarni tok (€)
		A	B	C	D	E	A	C+E-B	C+E-B-A
2014	0	2.185,94	0,00	1.748,75	0,00	-437,19	2.185,94	1.748,75	-437,19
2015	1	12.911,58	0,00	10.329,26	0,00	-2.582,32	12.066,90	9.653,51	-2.413,38
2016	2	35.849,33	0,00	28.679,47	0,00	-7.169,86	31.312,19	25.049,76	-6.262,43
2017	3	44.164,63	0,00	35.331,70	0,00	-8.832,93	36.051,49	28.841,19	-7.210,30
2018	4	0,00	541,45	2.300,00	0,00	1.758,55	0,00	1.754,66	1.341,59
2019	5	0,00	541,45	2.300,00	0,00	1.758,55	0,00	1.639,87	1.253,82
2020	6	0,00	541,45	2.300,00	0,00	1.758,55	0,00	1.532,59	1.171,80
2021	7	0,00	541,45	2.300,00	0,00	1.758,55	0,00	1.432,32	1.095,14
2022	8	0,00	541,45	2.300,00	0,00	1.758,55	0,00	1.338,62	1.023,49
2023	9	0,00	1.041,25	2.300,00	0,00	1.258,75	0,00	1.251,05	684,68
2024	10	0,00	1.041,25	2.300,00	0,00	1.258,75	0,00	1.169,20	639,88
2025	11	0,00	1.041,25	2.300,00	0,00	1.258,75	0,00	1.092,71	598,02
2026	12	0,00	1.041,25	2.300,00	0,00	1.258,75	0,00	1.021,23	558,90
2027	13	0,00	1.041,25	2.300,00	0,00	1.258,75	0,00	954,42	522,34
2028	14	0,00	1.041,25	2.300,00	0,00	1.258,75	0,00	891,98	488,16
2029	15	0,00	1.041,25	2.300,00	0,00	1.258,75	0,00	833,63	456,23
2030	16	0,00	1.041,25	2.300,00	0,00	1.258,75	0,00	779,09	426,38
2031	17	0,00	1.041,25	2.300,00	0,00	1.258,75	0,00	728,12	398,49

VEČNAMENSKI OBJEKT NARAPLJE

2032	18	0,00	1.041,25	2.300,00	0,00	1.258,75	0,00	680,49	372,42
2033	19	0,00	1.041,25	2.300,00	19.022,30	1.258,75	0,00	635,97	5.607,88
SKUPAJ		95.111,48	14.161,00	112.889,18	19.022,30	22.639,00	81.616,52	83.029,16	315,91

EIRR= 7,23805%

ENSV= 315,91 EUR

RNSV= 0,003871

Obrazložitev:

- Dejanska ekonomska življenjska doba investicije presega zadevno referenčno časovno obdobje, zato prikazujemo tudi preostalo vrednost (ocenjena tržna vrednost po zaključku referenčnega obdobja – 20 % vrednosti investicije), kar znaša 19.022,30 EUR,
- Glede na vrsto investicije smo upoštevali 7% stopnjo za diskontiranje,
- V investicijo so vključeni učinki JAVNO DOBRO,
- Denarni tok je v ekonomski analizi pozitiven,
- Stroške investicije smo očistili davkov in prispevkov.

8.2.3 Neto sedanja vrednost in interna stopnja donosa pri ekonomski analizi

Aproksimativni izračun neto sedanje vrednosti na podlagi podatkov iz zgornje preglednice in še z nekaterimi vhodnimi podatki je sledeč:

- vrednost investicije (očiščena davkov in prispevkov) = 95.111,48 EUR ,
- ekonomska doba investicije $i = 20$ let,
- diskontna stopnja $p = 7\%$.

$$\text{ENSV} = \sum_{i=1}^n \frac{I_i}{(1+p)^i} \quad \text{ENSV} = \mathbf{315,91}$$

Kot pričakovano je ekonomska neto sedanja vrednost investicije pozitivna in znaša 315,91 EUR, ekonomska stopnja donosnosti je prav tako pozitivna.

Ekonomska interna stopnja donosnosti

$$\text{EIRR} = \mathbf{7,23805\%}$$

Relativna neto sedanja vrednost

$$\text{RNSV} = \mathbf{0,003871}$$

Obrazložitev:

- Ekonomska doba projekta je bila narejena na 20 let
- Neto sedanja vrednost je ob uporabljeni 7% letni obrestni meri (diskontni stopnji) pozitivna
- Interna stopnja donosa je pri uporabljeni diskontni stopnji pozitivna in znaša 7,23805%
- Pomeni, da je interna stopnja donosnosti višja od uporabljene individualne diskontne stopnje, s čimer je investicija v tem primeru ekonomsko upravičena in nam pove, da vsaka enota vložene kapitala ustvari 0,23805 enote akumulacije.

8.2.4 Izračun ekonomske upravičenosti operacije z jasno opredeljenimi izhodišči

Pri izračunu neto sedanje vrednosti smo upoštevali naslednje parametre:

- a. vrednost investicije (očiščena davkov in prispevkov): **95.111,48 EUR**
- b. ekonomska doba investicije v letih: 20 let
- c. diskontna stopnja: 7%

Ekonomska neto sedanja vrednost (ENSV) je pri teh parametrih pozitivna in znaša **315,91 EUR**. S tega vidika je investicija ekonomsko upravičena.

Upoštevajoč investicijsko vrednost, prihodke in stroške poslovanja je **ekonomska doba** povračila investicijskih stroškov po stalnih cenah izračunana na **20 let**.

Pri uporabljeni diskontni stopnji, ki je po stalnih cenah 7% je ekonomska neto sedanja vrednost pozitivna, kar pomeni, da je interna stopnja donosnosti višja od uporabljene individualne diskontne stopnje, s čimer je investicija v tem primeru upravičena in ekonomsko smiselna.

Interna stopnja donosnosti v ekonomski analizi znaša **7,163039%**, kar je več od upoštevane diskontne stopnje 7%.

Odločitev **ZA investicijo** je ekonomsko upravičeno in sprejemljiva.

8.3 Analiza občutljivosti in tveganj

8.3.1 Splošna analiza občutljivosti

V okviru analize občutljivosti ugotavljamo mogoče spremembe ključnih spremenljivk, ki vplivajo na izvedbo projekta. Ocenjujemo, da so pri izvedbi investicije in njenem obratovanju prisotni naslednji potencialni kritični faktorju (spremenljivke):

- spremembe investicijske vrednosti,
- faktorji, ki vplivajo na stroške investicije in

Priročnik DD4 predlaga, da so kot kritične spremenljivke obravnavane tiste, katerih 1% sprememba ima za posledico 5% spremembo prvotne vrednosti finančne neto sedanje vrednosti investicije.

1. Pri povečanju operativnih stroškov za 1% znaša NSV pri 7% diskontni stopnji -114.246,50 EUR

Učinek na NSV = $-114.170,19 / -114.246,50 * 100 = 99,93\%$

Ugotovitev: Pri povečanju obratovalnih stroškov za 1% se dinkontirana NSV spremeni za **0,07%**.

SPREMENLJIVKA NI KRITIČNA.

2. Pri povečanju vrednosti investicije za 1% znaša NSV pri 7% diskontni stopnji -115.308,97 EUR

Učinek na NSV = $-114.170,19 / -115.308,97 * 100 = 99,01\%$

Ugotovitev: Pri povečanju investicijskih stroškov za 1% se dinkontirana NSV spremeni za **0,99%**.

SPREMENLJIVKA NI KRITIČNA.

Ocenjujemo, da verjetnost tveganj obstaja, vendar ne ogroža odločitve za izvedbo projekta.

9 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM

9.1 *Potrebna investicijska dokumentacija*

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ v 4. členu določa mejne vrednosti za pripravo in obravnavo posamezne vrste investicijske dokumentacije po stalnih cenah z vključenim davkom na dodano vrednost in sicer:

1. za investicijske projekte z ocenjeno vrednostjo **med 300.000 in 500.000 EUR** najmanj dokument identifikacije investicijskega projekta;
2. za investicijske projekte nad vrednostjo 500.000 EUR dokument identifikacije investicijskega projekta in investicijski program;
3. za investicijske projekte nad vrednostjo 2.500.000 EUR dokument identifikacije investicijskega projekta, predinvesticijska zasnova in investicijski program;
4. za investicijske projekte pod vrednostjo 300.000 EUR je treba zagotoviti dokument identifikacije investicijskega projekta, in sicer:
 - a) pri tehnološko zahtevnih investicijskih projektih;
 - b) pri investicijah, ki imajo v svoji ekonomski dobi pomembne finančne posledice (na primer visoki stroški vzdrževanja);
 - c) kadar se investicijski projekti (so)financirajo s proračunskimi sredstvi.

Celotna ocenjena vrednost investicije vključno z davkom na dodano vrednost po stalnih cenah je ocenjena na **132.707,52 EUR**. Ocenjena vrednost celotnega projekta po stalnih cenah ne presega 300.000,00 EUR, vendar se financira iz javnih sredstev, zato je bilo potrebno v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ za omenjen projekt izdelati Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP).

9.2 Smiselnost investicije

Investicija je upravičena iz ekonomskega stališča in ni ekološko sporna. Investicija bo imela izključno pozitivni vpliv na izboljšanje stanja okolja, s tem pa tudi na bivalno ugodje prebivalcev naselja Majšperk.

Realizacija investicije bo pripomogla k višji kakovosti bivanja, povečanju poseljenosti in razvoju obravnavanega območja in regije.

Projekt je primeren za realizacijo, kar potrjujejo njegovi učinki, ki se odražajo v zagotavljanju kakovosti življenja nasploh ter zmanjšanju negativnih vplivov na okolje oziroma živo naravo.

Načrtovana naložba je ekonomsko upravičena na osnovi naslednjih kriterijev:

2. ENSV znaša **315,91 EUR**,
3. EIRR znaša **7,23805 %**.

Neto denarni tok v finančni analizi je v referenčni dobi negativen in znaša **-114.170,19 EUR**, zato je investicija upravičena do sofinanciranja.

Z Dokumentom identifikacije investicijskega projekta se ugotavlja, da je investicija za nadaljnji razvoj območja nujno potrebna.

Dokumentom identifikacije investicijskega projekta je bilo potrebno izdelati v skladu s 4. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list št. 60/2006 in 54/2010) ter DELOVNIM DOKUMENTOM 4 – Navodila za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi (08/2006).

10 PRIKAZ REZULTATOV OCENJEVANJA Z UTEMELJITVIJO UPRAVIČENOSTI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

Načrtovana naložba v večnamenski objekt Naraplje je ekonomsko upravičena na osnovi naslednjih kriterijev in meril:

- zagotoviti možnost razvoja dejavnosti društev s področja kulture in turizma in
- izpolniti zaveze iz Strategije razvoja Občine Majšperk.

Projekt je primeren za realizacijo, kar potrjujejo njegovi učinki, ki se odražajo v preskrbi območja z ustrezno in nujno potrebno infrastrukturo. V skladu z določili Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS, št. 60/06 in 54/2010) je vsa potrebna investicijska dokumentacija pripravljena. Realizacija izvedbe projekta je pogojena s pridobitvijo predvidenih nepovratnih finančnih sredstev.

Z investicijskim programom se ugotavlja, **da je investicija, v izbrani varianti upravičena in potrebna**.

Vrednost investicije (tekoče cene) z DDV:	134.857,54 EUR
Trajanje izvedbe del	2014-2017
Viri financiranja (tekoče cene): <ul style="list-style-type: none"> • Občina Majšperk 	134.857,54 EUR
Finančna neto sedanja vrednost	-114.170,19 EUR
Ekonomska neto sedanja vrednost	315,91 EUR
Ekonomska interna stopnja donosnosti	7,23805 %

Naložba izkazuje negativno finančno neto sedanjo vrednost, kar pomeni, da brez javnih sredstev investicija ni mogoča. Pozitivna ekonomska neto sedanja vrednost izkazuje, da ima projekt takšne ekonomske učinke, da je družbeno koristen in zato smiseln. Tudi interna stopnja donosnosti je višja od predpisane 7% diskontne stopnje.
