



OBČINA OPLOTNICA

OBČINSKI SVET

Goriška cesta 4, 2317 OPLOTNICA

tel.: 02/845-09-00, faks.: 02/845-09-09, e-mail: obcina@oplotnica.si

1. NAZIV GRADIVA ZA TOČKO DNEVNEGA REDA NA OBČINSKEM SVETU
1. točka dnevnega reda
POTRDITEV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA – DIIP – a ZA PROJEKT UREDITEV AVTOBUSNEGA POSTAJALIŠČA V POBREŽJU
2. PREDLAGATELJ GRADIVA
ŽUPAN
3. VSEBINA GRADIVA
Potrditev investicijskega projekta Diip-a za projekt Ureditev avtobusnega postajališča v Pobrežju
4. DELOVNO TELO PRISTOJNO ZA OBARAVNAVO
Komisija za okolje in prostor, komunalno infrastrukturo in investicije
5. POROČEVALEC NA SEJI OBČINSKEGA SVETA
Bojana Vučina
6. PRIPRAVLJALEC GRADIVA
Občinska uprava, ŠC Slovenske Konjice - Zreče
7. PRAVNE PODLAGE:
**Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10, 27/16)
Statut Občine Oplotnica (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 49/2015).**
8. SKLEP:
Občinski svet Občine Oplotnica potrdi Diip – dokument identifikacije investicijskega projekta za projekt Ureditev avtobusnega postajališča v Pobrežju.
9. POSTOPEK IN NAČIN SPREJEMANJA:
-navadna večina opredeljenih glasov
10. FINAČNE POSLEDICE.
Sprejetje predlaganega sklepa ima neposredne posledice za proračun občine Oplotnica.

MATJAŽ ORTER
ŽUPAN



V proračunu občine Oplotnica za leto 2020 je na proračunski postavki 0043510 Izgradnja avtobusnih postajališč predvidena ureditev avtobusnih postajališč v Pobrežu v skupni višini 32.400,00€ z DDV. Za izvedbo investicije so na razpolago lastna sredstva.

V skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10, 27/16) je za investicijske projekte pod vrednostjo 300.000,00€ potrebno zagotoviti dokument identifikacije investicijskega projekta, in sicer:

- pri tehnološko zahtevnih investicijskih projektih,
- pri investicijah, ki imajo v svoji ekonomski dobi pomembne finančne posledice (npr. povzročajo visoke stroške vzdrževanja),
- kadar se investicijski projekti (so)financirajo s proračunskimi sredstvi.

Za projekt je potrebno pripraviti DIIP – dokument identifikacije investicijskega projekta in ga potrditi na občinskem svetu.

PREDLOG SKLEPA

Občinskemu svetu predlagamo, da dokument obravnava, o njem razpravlja in sprejme naslednji sklep:

1.

Občinski svet Občine Oplotnica potrdi Diip – dokument identifikacije investicijskega projekta za projekt Ureditev avtobusnega postajališča v Pobrežu

Odobri se izvedba investicije.

Župan Občine Oplotnica
Matjaž Orter



OBČINA OPLOTNICA

Občinska uprava
Goriška cesta 4, 2317 OPLOTNICA

tel.: 02/845-0900, fax: 02/845-0909, e-mail: obcina@oplotnica.si

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

za projekt:

»UREDITEV AVTOBUSNEGA POSTAJALIŠČA V POBREŽJU«

Slovenske Konjice, september 2020


DIIP vsebuje informacije, ki predstavljajo poslovno skrivnost in jih brez izrecnega pisnega soglasja naročnika ni dovoljeno kopirati, posredovati tretjim osebam ali kako drugače objaviti.

INVESTITOR:

OBČINA OPLOTNICA
Goriška cesta 4, Oplotnica
župan: Matjaž Orter

IZVAJALEC
INVESTICIJSKE
DOKUMENTACIJE:

ŠC SLOVENSKE KONJICE-ZREČE
Tattenbachova ulica 2a, Slovenske Konjice
direktorica: mag. Jasmina Mihelak Zupancič



Nalogo izdelal:

mag. Brigita Kukovič, ŠC Slov. Konjice-Zreče



Sodelavec investitorja:

Bojana Vučina, dipl.upr.org., Občina Oplotnica

VSEBINA

1	UVOD	4
2	PREDSTAVITEV INVESTITORJA.....	5
2.1	Predstavitel investitorja.....	5
2.2	Osnovni podatki o investitorju.....	7
2.3	Odgovorna osebe za izdelavo projektne, investicijske dokumentacije, tehnične dokumentacije ter odgovorne osebe za izvajanje investicije.....	7
2.4	Spisek strokovnih podlag	8
2.5	Zakonske podlage	8
3	OPIS OBSTOJEČEGA STANJA.....	8
4	VARIANTE VLAGANJ.....	9
4.1	Varianta 1 – »brez investicije«.....	9
4.2	Varianta 2 – »z investicijo«	9
5	OPIS INVESTICIJE	9
5.1	Opredelitev vrste investicije	9
5.2	Namen investicije.....	10
5.3	Cilji investicije	10
5.4	Lokacija investicije.....	10
5.5	Opis investicije	10
5.6	Ciljne skupine+.....	11
5.7	Varstvo okolja.....	11
5.8	Kadrovsko –organizacijski vidik projekta	11
5.9	Predračunski elaborat.....	12
6	VRSTA POTREBNE DOKUMENTACIJE	12
6.1	Investicijska dokumentacija	12
6.2	Projektna, tehnična in druga dokumentacija	13
7	VREDNOST INVESTICIJE IN VIRI FINANCIRANJA	13
7.1	Vrednost investicije	13
7.2	Viri financiranja.....	13
8	ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI.....	14
8.1	Prihodki in stroški.....	14
8.2	Analiza občutljivosti in analiza tveganj	14
9	TERMINSKI PLAN.....	15
10	ZAKLJUČEK.....	16

Kazalo slik:

Slika 1: Oplotnica.....	6
Slika 2: Naselja v občini Oplotnica.....	7

Kazalo tabel:

Tabela 1: Osnovni podatki o naseljih občine Oplotnica (Vir: SURS, 2019)	5
Tabela 2: Rekapitulacija vlaganj.....	12
Tabela 3: Načrtovani stroški investicije.....	13
Tabela 4: Načrtovana dinamika vlaganj v stalnih cenah (avgust 2020)	14
Tabela 5: Terminski plan dokumentacije	15
Tabela 6: Terminski plan izvedbe investicije.....	15

1 UVOD

Občina Oplotnica meri 33,2 km² in v njej živi po podatkih iz centralnega registra prebivalstva 4.118 prebivalcev (SURS, 2019). Njeno celotno podobo oblikuje 21 zaselkov (Božje, Brezje pri Oplotnici, Čadram, Dobriška vas, Dobrova pri Prihovi, Gorica pri Oplotnici, Koritno, Kovaški vrh, Lačna Gora, Malahorna, Markečica, Okoška Gora, Oplotnica, Pobrež, Prihova, Raskovec, Straža pri Oplotnici, Ugovec, Zgornje Grušovje, Zlogona Gora in Zlogona vas), ki nizajo krajinske značilnosti in oblikujejo pokrajino. Občina Oplotnica leži na nadmorski višini 295-937 m.

Investitor z dokumentom identifikacije investicijskega programa podaja osnovo za utemeljenost investicijskih vložkov v ureditev dveh avtobusnih postajališč v naselju Pobrež.

Projekt ureditve avtobusnih postajališč je v fazi pridobivanja dokumentacije in gradbenega dovoljenja, zaključek projekta bo novembra 2020.

Ocenjena vrednost načrtovane investicije znaša 32.400 EUR z DDV.

Viri za izvedbo projekta so zagotovljeni na postavki občinskega proračuna 0043510 (ureditev avtobusnega postajališča v Pobrežu) v NRP.

Dokument je pripravljen v skladu z zakonodajo ter z metodološkimi usmeritvami, ki izhajajo iz uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja na področju javnih financ.

2 PREDSTAVITEV INVESTITORJA

2.1 Predstavitev investitorja

Občino Oplotnica, ki se razprostira na 33,2 km² površine, sestavlja 21 malih in srednje velikih naselij (Božje, Brezje pri Oplotnici, Čadram, Dobriška vas, Dobrova pri Prihovi, Gorica pri Oplotnici, Koritno, Kovaški vrh, Lačna Gora, Malahorna, Markečica, Okoška Gora, Oplotnica, Pobrež, Prihova, Raskovec, Straža pri Oplotnici, Ugovec, Zgornje Grušovje, Zlogona Gora in Zlogona vas). Največje in središčno je naselje Oplotnica (1.418 prebivalcev), po številu prebivalcev ji po velikosti sledijo Malahorna, Čadram in Gorica pri Oplotnici.

Kar zadeva tipe naselij, v občini Oplotnica prevladujejo strnjena in razložena naselja. Strnjena naselja se pojavljajo v obliki gručastih vasi (Božje, Čadram, Dobriška vas, Dobrova pri Prihovi, Malahorna, Markečica) in obcestnih vasi (Lačna Gora, Pobrež, Zgornje Grušovje). Razložena naselja najdemo predvsem po vrhovih slemen (Gorica pri Oplotnici - delno, Prihova, Straža pri Oplotnici), po robovih dolin (Gorica pri Oplotnici - delno, Raskovec) ter na pobočjih (Brezje, Koritno, Okoška Gora, Ugovec, Zlogona Gora). Na območju občine najdemo tudi dva zaselka (Kovaški vrh, Zlogona vas) ter eno t.i. podeželsko mesto, oz. središče (Oplotnica).

Tabela 1: Osnovni podatki o naseljih občine Oplotnica (Vir: SURS, 2019)

Naselje	Prebivalstvo	Površina teritorialne enote [km ²]	Gostota naseljenosti
Božje	128	2,6	49,5
Brezje pri Oplotnici	118	3,1	37,6
Čadram	263	1,3	205,3
Dobriška vas	74	1,0	70,8
Dobrova pri Prihovi	52	1,3	40,8
Gorica pri Oplotnici	238	0,7	324,2
Koritno	190	3,8	50,0
Kovaški Vrh	48	1,4	33,3
Lačna Gora	172	1,3	132,1
Malahorna	309	2,0	150,8
Markečica	114	1,9	58,6
Okoška Gora	213	0,9	244,8
Oplotnica	1.420	3,6	394,0
Pobrež	151	1,0	148,2
Prihova	73	1,3	57,3
Raskovec	71	0,7	98,2
Straža pri Oplotnici	74	0,8	91,6
Ugovec	151	1,2	130,8
Zgornje Grušovje	120	1,3	90,4
Zlogona Gora	93	0,6	165,9
Zlogona vas	46	1,2	37,9
SKUPAJ OBČINA OPLOTNICA	4.118	33,2	124,04

Poleg vseh naštetih oblik naselij so na obravnavanem območju tudi samotne kmetije (v hribovitih predelih območja občine z najvišjimi nadmorskimi višinami – SZ del) ter razne druge, posamezne grajene strukture (lovske in gozdne postojanke, mlini, žage, sakralni objekti, ipd.).

Na občino Oplotnica mejijo občine Zreče, Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica. Občina svojo turistično ponudbo povezuje tudi s sosednjimi občinami.



Slika 1: Oplotnica

Statistični podatki o občini Oplotnica (vir SURS):

Prebivalstvo


Kategorija	leto 2015	leto 2018
Prebivalstvo	4.046	4.100
gospodinjstva	1.459	1.463
povprečna velikost gospodinjstva	2,80	2,80
število družin	1.185	1.203
povprečno št. Otrok v vseh družinah	1,22	1,23

Gospodarstvo

	Število podjetij	Število oseb, ki delajo	Prihodek [1000 EUR]	Število oseb, ki delajo na podjetje v občini
občina Oplotnica	270	619	42.481	2,3
od tega mikro podjetja	260			
majhna podjetja	8			
srednje velika podjetja	2			

2.2 Osnovni podatki o investitorju

Investitor:	Občina Oplotnica
Sedež poslovanja:	Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica
Matična št.:	1357506
Davčna številka:	70271046
Odgovorna oseba:	Matjaž Orter, župan
Kontaktna oseba:	Bojana Vučina, višji svetovalec I Aleš Hren, direktor občinske uprave
Telefon:	02/845 09 00
fax:	03/845 09 09
E-mail:	obcina@oplotnica.si
Območje investicije:	1206/2, 1209, 962/4, 1284/1, vse k.o. Zgornje Grušovje
Transakcijski račun:	01371-0100009759

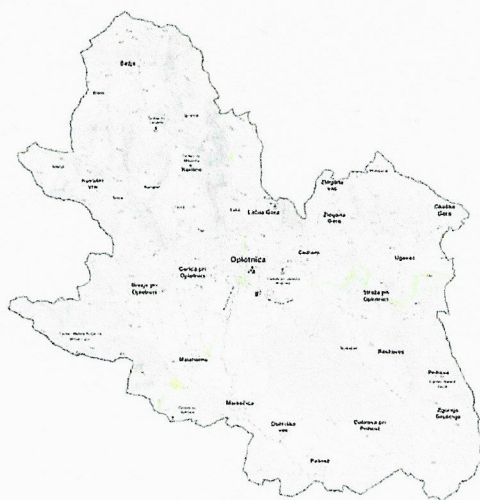

Slika 2: Naselja v občini Oplotnica

2.3 Odgovorna osebe za izdelavo projektne, investicijske dokumentacije, tehnične dokumentacije ter odgovorne osebe za izvajanje investicije

Za izdelavo projektne, tehnične in investicijske dokumentacije so odgovorni:

- Edvard Brunčič, Koning d.o.o., Slovenske Konjice
- Bojana Vučina, dipl. upr. org., višji svetovalec I, Občina Oplotnica

- mag. Brigita Kukovič, strokovna delavka, ŠC Slovenske Konjice–Zreče.

Odgovorni za izvajanje investicije so:

- Matjaž Orter, župan Občine Oplotnice,
- Aleš Hren, dipl. ekon., direktor občinske uprave, Občina Oplotnica
- Bojana Vučina, dipl. upr. org., višji svetovalec I., Občina Oplotnica.

Odgovoren za izvajanje nadzora nad izvedbo investicije je:

- izvajalec bo izbran v skladu z Zakonom o javnih naročilih.

Izvajalec projekta bo izbran v skladu z Zakonom o javnih naročilih (ZJN-3). Projektno tehnično dokumentacijo in druge strokovne podlage ter gradbeno dovoljenje bo investitor zagotovil pred samim pričetkom izvedbe naložbe.

2.4 Spisek strokovnih podlag

Osnova za izdelavo DIIP je naslednja dokumentacija:

- Popis del, Občina Oplotnica, avgust 2020
- Lokacijska informacija, št. 371-11/2020-18 z dne 23.9.2020, Občina Oplotnica;
- Načrt razvojnih programov za leto 2020, Občina Oplotnica;

2.5 Zakonske podlage

Projekt »Ureditev avtobusnega postajališča v Pobrežu« bo izveden ob upoštevanju zakonskih predpisov in strateških dokumentov, ki se nanašajo na ureditev infrastrukture.

3 OPIS OBSTOJEČEGA STANJA

Na obravnavanem območju je izveden cestni odsek občinska lokalna cesta LC 440271 Oplotnica - Tepanje. Cesta poteka v naselju Pobrež, znotraj območja omejene hitrosti 30 km/h. Cesta je asfaltirana v povprečni širini 5,0m-5,50m z enostranskim pločnikom. Območje je delno urejeno z cestno razsvetljavo na drogovih elektro distributerja.

V naselju Pobrež ni urejenega avtobusnega postajališča za ustavljanje avtobusov, zato le-ti ustavljajo kar na vozišču. Takšno ustavljanje je nevarno za vse udeležence v prometu.

4 VARIANTE VLAGANJ

Dokument identifikacije investicijskega projekta temelji na v točki 2.4 opredeljenih strokovnih podlagah.

4.1 Varianta 1 – »brez investicije«

Varianta »brez« investicije pomeni ohranitev obstoječega stanja., kar pomeni, da se v naselju Pobrež ne uredi avtobusno postajališče.

Variante 1 v nadaljevanju ne obravnavamo, saj ne spreminja obstoječega stanja.

4.2 Varianta 2 – »z investicijo«

Varianto 2 predstavlja izvedba projekta »Ureditev avtobusnega postajališča v Pobrežu«.

Za zagotovitev večje varnosti se uredita dve avtobusni postajališči v naselju Pobrež. Postajališči sta predvideni na obstoječi voziščni konstrukciji – lokalni cesti.

Predmet načrtovanega projekta je:

- Ureditev vertikalne ter horizontalne prometne signalizacije avtobusnih postajališč;
- Na zahodnem postajališču se uredi pločnik s čakališčem;
- Avtobusna postajališča se opremi z nadstreškom za potnike;
- Prilagoditev širine vozišča – asfaltiran del širine 5,5m;
- Ureditev prehoda za pešce ob zahodnem postajališču;
- Ureditev cestne razsvetljave na območju novega prehoda za pešce.

Izvedba projekta (varianta 2) prinaša številne pozitivne učinke. Zlasti bo pozitiven učinek na prometno varnost, zato je varianta 2 predmet nadaljnje obravnave in jo podrobneje opredelimo v nadaljevanju.

5 OPIS INVESTICIJE

5.1 Opredelitev vrste investicije

Vrsta objekta glede na namen in funkcijo:

- objekta glede na namen in funkcijo:

- stavba:	/
- gradbeno inženirski objekt:	/
- drugi gradbeni posegi:	/
- enostavni objekt:	/
- nezahtevni objekt	Ceste - prometne površine zunaj vozišča, počivališča, parkirišča, avtobusna postajališča , obračališča, servisne površine - nezahteven (površina do 200 m ²)

5.2 Namen investicije

Namen projekta je:

- ureditev dveh avtobusnih postajališč v naselju Pobrež.

5.3 Cilji investicije

Osnovni cilji, ki jih zasledujemo z izvedbo projekta:

- povečati prometno varnost za vse udeležence v prometu na območju naselja Pobrež;
- povečati uporabo javnega potniške prometa;
- zmanjšanje onesnaževanja okolja in ožvitev podeželja;
- omogočiti nadaljnji razvoj naselja in občine.

5.4 Lokacija investicije

Projekt se bo izvajal na naslednjem območju:

št. Parcele	št. K.O.	K.o.	Poseg [m ²]
1206/2	764	Zgornje Grušovje	9,47
1209	764	Zgornje Grušovje	78,8
962/4	764	Zgornje Grušovje	3,75
1284/1	764	Zgornje Grušovje	6,6

5.5 Opis investicije

Predmet investicije je ureditev dveh avtobusnih postajališč v naselju Pobrež.

Za izvedbo projekta je potrebno zagotoviti projektno tehnično dokumentacijo. Glede na vrsto objekta je potrebno pred pričetkom del pridobiti gradbeno dovoljenje.

Investicijski projekt zajema:

- ureditev prometne signalizacije avtobusnih postajališč;
- ureditev pločnika s čakališčem;
- opremo avtobusnih postajališč z nadstreškom za potnike;
- prilagoditev širine vozišča – asfaltiran del širine 5,5m;
- ureditev prehoda za pešce ob zahodnem postajališču;
- ureditev cestne razsvetljave na območju novega prehoda za pešce.

Vsa dela morajo izvajati strokovno usposobljene in pooblašene osebe z upoštevanjem vseh varnostnih predpisov. Pri izvajanju projekta je potrebno zagotoviti gradbeni nadzor.

5.6 Ciljne skupine

Ciljne skupine projekta so:

- prebivalci naselja Pobrež in drugi občani občine Oplotnica,
- obiskovalci in turisti,
- vsi ostali uporabniki.

5.7 Varstvo okolja

Izvedba investicije bo potekala skladno s predpisi o varstvu okolja.

Z novo ureditvijo ceste se bo vpliv hrupa na okolje izboljšal. Nevarnosti preseganja dovoljenih ravni hrupa ni.

Glede na bistveno večjo ravnost nove voziščne ploskve in novo prometno ureditev bo promet bolj tekoč in hkrati umirjen, posledica pa zmanjšanje emisije izpušnih plinov v okolje in manjše emisije prašnih delcev.

Nasipne in ukopne brežine bodo po izvedenih delih humusirane in zatravljene ter ustrezno zasajene. Zasaditev z višjeraslo vegetacijo ni predvidena.

5.8 Kadrovsko –organizacijski vidik projekta

Investitor je Občina Oplotnica, s sedežem Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica.

Občina Oplotnica ima naslednje organe:

- župan
- podžupan
- občinska uprava
- občinski svet
- komisije
- nadzorni odbor.

Župan predstavlja in zastopa občino ter skrbi in odgovarja za izvršitev sklepov občinskega sveta. Vodi, nadzira in usmerja delo občinske uprave.

Občinski svet sprejema statut občine, odloke in druge občinske akte, prostorske plane in plane razvoja občine, občinski proračun in zaključni račun, nadzoruje delo župana, odloča o odtujitvi in pridobitvi nepremičnin, ustanavlja gospodarske in druge javne zavode, določa višino prispevkov ipd..

Nadzorni odbor opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev proračuna, nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Občinska uprava Občine Oplotnica je organizirana kot enovit organ.

Za izvedbo investicije je odgovoren župan s strokovnimi sodelavci v okviru občinske strokovne službe. Odgovorna za spremljanje izvajanja projekta je višja svetovalka I., Bojana Vučina, dipl.upr.org.. Finančno spremljanje projekta bo zagotovljeno v okviru računovodske službe občine. Nove zaposlitve v povezavi z izvedbo investicije niso predvidene.

Izvajalci del in aktivnosti, ki so predmet investicije, bodo izbrani na osnovi predpisanega postopka v skladu z ZJN – 3 (Ur. L. RS št. 91/2015).

5.9 Predračunski elaborat

Potrebna vlaganja v objekt so razvidna iz popisa del (stalne cene avgust 2020).

Tabela 2:Rekapitulacija vlaganj

z.št.	Aktivnost - stroški	vrednost brez DDV	22% DDV	Skupaj	%
1	gradbeni nadzor	819,67	180,33	1.000,00	3,09%
2	projektno tehnična dokumentacija	1.885,25	414,75	2.300,00	7,10%
3	gradnja	23.852,46	5.247,54	29.100,00	89,81%
	SKUPAJ	26.557,38	5.842,62	32.400,00	100,00%

6 VRSTA POTREBNE DOKUMENTACIJE

6.1 Investicijska dokumentacija

Ocenjena vrednost projekta znaša 32.400,00 EUR z DDV. Glede na določila Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS 60/2006, 54/2010) je za izdelavo programov za javna naročila investicijska značaja za investicijske projekte pod vrednostjo 300.000,00 EUR potrebno **zagotoviti dokument identifikacije investicijskega projekta** v primeru, če gre za tehnološko zahtevne investicijske projekte, če gre za investicijske projekte, ki imajo v svoji ekonomski dobi pomembnejše finančne posledice (visoki stroški vzdrževanja) oz. kadar se investicijski projekti (so)financirajo s proračunskimi sredstvi.

Glede na Uredbo predinvesticijska zasnova in investicijski program nista potrebna.

6.2 Projektna, tehnična in druga dokumentacija

Pred izvedbo načrtovanih del je potrebno zagotoviti ustrezno projektno tehnično dokumentacijo.

Investitor bo pred pričetkom gradbenih del pridobil gradbeno dovoljenje.

7 VREDNOST INVESTICIJE IN VIRI FINANCIRANJA

7.1 Vrednost investicije

Vrednost investicije je oblikovana na podlagi popisa del, terminsko je izvedba del usklajena z zagotovljenimi viri financiranja. Viri financiranja so se zagotovijo v proračunu občine Oplotnica.

Tabela 3: Načrtovani stroški investicije

Aktivnost - stroški	vrednost z DDV v stalnih cenah	vrednost z DDV v tekočih cenah
nadzor	1.000,00	1.000,00
projektno tehnična dokumentacija	2.300,00	2.300,00
gradnja	29.100,00	29.100,00
SKUPAJ	32.400,00	32.400,00

Osnova za oblikovanje predračunske vrednosti je popis del za izvedbo (avgust 2020). Preračun v tekoče cene ni narejen, saj je predvidena dinamika investiranja krajša od enega leta.

7.2 Viri financiranja

Za izvedbo investicije, ki je opredeljena pod nazivom »Ureditev avtobusnega postajališča v Pobrežu« so načrtovani naslednji viri financiranja:

- **Lokalna skupnost** (proračun Občine Oplotnica) v skupni višini **32.400,00 EUR** kar predstavlja **100%** vrednosti investicije.

Načrtovan vložek v izvedbo investicije je opredeljen v Odloku o občinskem proračunu Občine Oplotnica za leto 2020. Sredstva za izvedbo projekta so zagotovljena na postavki 0043510.

Tabela 4: Načrtovana dinamika vlaganj v stalnih cenah (avgust 2020)

Viri financiranja	leto 2020	%
lastni viri - proračun občine	32.400,00	100,00%
drugi viri	0,00	0,00%
SKUPAJ	32.400,00	100,00%

Upoštewane so stalne cene iz meseca avgusta 2020, izvedba projekta bo zaključena v novembru 2020, zaradi česa ni narejen preračun v tekoče cene (dinamika financiranja investicije je krajša od enega leta).

8 ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI

V nadaljevanju podajamo ekonomsko analizo načrtovane investicijske operacije. Vse vrednosti so podane v stalnih cenah iz meseca avgusta 2020.

8.1 Prihodki in stroški

Prihodki

Izvedba projekta omogoča doseganje zastavljenih ciljev povezanih z razvojem kraja, povečanjem prometne varnosti za udeležence v prometu in izboljšanju okoljskih vplivov. Neposrednih prihodkov ne ustvarja.

Stroški obratovanja

Stroške obratovanja predstavljajo stroški vzdrževanja novozgrajenega objekta. Sredstva za pokrivanje stroškov se zagotovijo v občinskem proračunu.

8.2 Analiza občutljivosti in analiza tveganj

V zvezi z izvedbo investicije predstavljajo tveganja predvsem:

- čas izvedbe investicije,
- vrednost investicije.

V primeru podaljšanja roka izvedbe investicije lahko to pomeni višje stroške same izvedbe investicije. Za zmanjšanje teh tveganj je potrebno skrbno in gospodarno izvesti postopek naročanja in dosledno zasledovati terminski plan projekta.

V kolikor investicija ne bi bila izvedena, pomeni ohranitev obstoječega stanja, kar pa ni v interesu načrtovanega razvoja kraja oz. občine.

Investitor bo skušal zmanjšati tveganja z doslednim izvajanjem nadzora nad izvedbo zastavljenih aktivnosti.

Kot sklepno oceno analize stroškov in koristi lahko podamo, da **so koristi**, ki jih pričakujemo, kljub temu, da gre za izvedbo investicije, ki ne izkazuje neposredne finančne učinkovitosti, **višje od stroškov in je investicija na ta način upravičena za financiranje.**

9 TERMINSKI PLAN

Tabela 5: Terminski plan dokumentacije

aktivnost	termin izvedbe
➤ Popis del z oceno stroškov	avgust 2020
➤ Lokacijska informacija	september 2020
➤ DIIP	september 2020
➤ Projektna dokumentacija	avgust – september 2020
➤ Gradbeno dovoljenje	september – oktober 2020
➤ Izbor izvajalcev	oktober 2020

Tabela 6: Terminski plan izvedbe investicije

➤ Začetek del	oktober 2020
➤ Zaključek del	november 2020
➤ Prenos v uporabo	december 2020

10 ZAKLJUČEK

Glede na navedene ugotovitve v povezavi z namenom izvedbe investicije, učinkov investicije, predračunsko vrednost investicijskih vlaganj ter pokritje investicijskih vlaganj, upravičeno sklepamo, da je investicija upravičena in potrebna za občino Oplotnica.

Investicija je vključena v Načrt razvojnih programov občine Oplotnica in je skladna z razvojnimi strategijami in politikami na regionalni in nacionalni ravni.

Opravičljivost vlaganj se bo kazala v naslednjih dejavnikih:

- povečanje prometne varnosti na območju naselja Pobrež;
- povečanje uporabe javnega potniškega prometa;
- zmanjšanje onesnaževanja okolja;
- omogočen bo nadaljnji razvoj naselja Pobrež in celotne občine Oplotnica.



OBČINA OPLOTNICA

Občinska uprava
Goriška cesta 4, 2317 OPLOTNICA

tel.: 02/845-09-00, faks.: 02/845-09-09, e-mail: obcina.@oplotnica.si

GLASOVNICA

za 3. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Oplotnica,
ki poteka od 15. 10. 2020 do 19. 10. 2020, do 12. ure.

NAVODILO:

O sklepu se glasuje tako, da član sveta obkroži besedo »da« ali »ne«.

Ali se strinjate, da se sprejme naslednji

SKLEP

1.

Občinski svet Občine Oplotnica potrdi Diip – dokument identifikacije investicijskega projekta za projekt Ureditev avtobusnega postajališča v Pobrežu

Odobri se izvedba investicije.

DA

NE

Ime in priimek ter podpis:
